

2026 年欠发达国有林场巩固提升任务插岗梁省级自然保护区管护中心苗圃基础设施建设项目

实施方案



甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心

中苑工程设计有限公司

2026 年 5 月

2026 年欠发达国有林场巩固提升任务插岗梁省级自然保护区管护 中心苗圃基础设施建设项目实施方案编制参与人员

建设单位：甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心

项目负责人：张鹏

技术负责人：冯俊江

审核：朱景 郭睿

设计单位：中苑工程设计有限公司

设计单位法定代表人：唐群济


设计单位项目负责人：涂梦如

审 定：涂梦如

审 核：王秀红

校 对：陈真荣

设计人员：赵倩



统一社会信用代码

91510100MA639JDUXM

营业执照

(副本) 副本编号: 10 - 1

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



名称 中苑工程设计有限公司

注册资本 伍仟万元整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2018年07月12日

法定代表人 唐群济

住所 中国(四川)自由贸易试验区成都高

新区益州大道北段777号1栋1单元13层
1306号

经营范围

许可项目: 建设工程勘察; 建设工程设计; 建设工程施工; 公路管理与养护; 公路工程监
理; 水利工程质量检测; 水利工程建设监理; 建筑智能化系统设计; 建筑劳务分包; 文物
保护工程施工; 人防工程设计; 地质灾害治理工程设计; 测绘服务; 国土空间规划编制;
建设工程监理; 地质灾害治理工程监理; 地质灾害治理工程勘察。(依法须经批准的项目, 以相关部门批准文件或许可证件
为准) 一般项目: 对外承包工程; 土石方工程施工; 建筑工程机械与设备租赁; 平面设计;
规划设计管理; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广; 图文设计制
作; 工业设计服务; 工程造价咨询业务; 水利相关咨询服务; 广告设计、代理; 图文设计制
作; 工业管理服务; 政府采购代理服务; 招投标代理服务; 信息技术咨询服务; 社会稳定
风险评估; 工程管理服务; 节能管理服务; 园林绿化工程施工; 环保咨询服务; 信息咨询
服务(不含许可类信息咨询服务); 资产评估; 单建式人防工程监理; 矿产资源储量估算
和报告编制服务; 城乡市容管理。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

登记机关



2024 年 5 月 28 日



工程设计资质证书

企业名称：中苑工程设计有限公司

详细地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道北段777号1栋1单元13层1306号

统一社会信用代码(或营业执照注册号)：91510100MA639JDUXM 经济性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

证书编号：A251034182 有效期：至2029年12月20日

法定代表人：唐群济

资质类别及等级：

市政行业乙级*****



发证机关：

四川省住房和城乡建设厅

2026年2月26日

2026 年中央财政 常态化帮扶资金（欠发达国有林场 巩固提升任务）项目实施方案评审意见

2026 年 6 月 17 日，甘肃省林业和草原局组织有关专家在兰州市对白龙江林业保护中心 9 个 2026 年中央财政常态化帮扶资金（欠发达国有林场巩固提升任务）项目实施方案（以下简称《方案》）进行了评审。专家通过听取汇报，查阅资料，经质询答疑后，形成如下意见

1. 《方案》严格按照《甘肃省林业和草原局关于下达 2026 年中央财政常态化帮扶资金（欠发达国有林场巩固提升）任务计划的通知》（甘林规函〔2026〕170 号）下达的建设内容设计，符合《甘肃省财政常态化帮扶资金管理实施办法》和《甘肃省欠发达国有林场巩固提升项目管理办法》相关要求。

2. 《方案》编制依据充分，内容全面，资金概算合理。专家组一致同意项目通过评审。

建议：按照专家意见建议进一步补充修改完善。

专家组组长：李毅

2026 年 6 月 17 日

2026年中央财政常态化帮扶资金
(欠发达国有林场巩固提升任务)项目实施方案评审会签字表

项目名称：2026年欠发达国有林场巩固提升任务插岗梁省级自然保护区管护中心苗圃基础设施建设项目

序号	姓名	单位职务	签名
1	李毅	甘肃农业大学教授	李毅
2	吴永华	兰州市园林科学研究所正高工	吴永华
3	姜成英	省林业科学研究院研究员	姜成英
4	陈道军	省林草局生态办高级工程师	陈道军
5	刘月华	省林草局生态办会计师	刘月华

目 录

第一章 总 论	1
一、项目概况	1
二、编制依据	2
第二章 项目区概况及背景	3
一、项目区基本概况	3
二、场址条件	6
三、项目现状照片及位置图	8
第三章 项目建设必要性及可行性	10
一、项目建设背景	10
二、项目建设必要性	11
三、建设的可行性	11
四、结论与建议	12
第四章 项目效益分析	13
一、生态效益	13
二、社会效益	13
三、经济效益	13
四、可持续效益	14
第五章 后续资产管护	14
一、项目后续管护	14
二、资产管护	15
第六章 保障措施	15
一、保障措施	15
第七章 保障措施	17
一、项目管理	17
二、公示公告	19

三、绩效管理	20
第八章 建设内容	22
一、设计规模及内容	22
二、建筑设计说明	22
第九章 环境影响评价	25
一、编制依据	26
二、环境保护	26
三、环境影响评价	27
四、环境保护措施	28
五、环境影响评价结论与建议	28
第十章 项目建设期限与进度安排	29
一、实施计划	29
第十一章 项目招投标	29
一、法律适用依据	30
二、采购实施方式	30
三、采购管理要求	30
第十二章 风险分析	31
一、风险因素分析	31
二、风险防范和化解措施	31
第十三章 投资概算及资金来源	32
一、工程概况、规模及范围	32
二、编制依据	32
三、项目投资概算及资金来源	33
四、投资概算表	33
第十四章 附件	34

1、附件 1 《插岗梁管护中心关于申报 2026 年欠发达国有林场巩固提升项目入库的报告》插管行字〔2025〕85 号 35

2、附件 2 《关于补充申报中央财政衔接推进乡村振兴补助资金欠发达国有林场巩固提升任务 2026 年项目的通知》 41

3、附件 3 《甘肃省财政厅关于下达 2026 年中央财政常态化帮扶资金预算的通知》甘财政兴（2026）7 号 45

4、附件 4 《甘肃省林业和草原局关于下达 2026 年中央财政常态化帮扶资金（欠发达国有林场巩固提升）任务计划的通知》（甘林规函〔2026〕170 号） 49

5、附件 5 《白龙江林业保护中心转下达 2026 年中央财政常态化帮扶资金(欠发达国有林场巩固提升)任务计划的通知》（白林规函〔2026〕13 号） 55

设计图纸 59

概算书 69

第一章 总 论

一、项目概况

1.项目名称：2026 年欠发达国有林场巩固提升任务插岗梁省级自然保护区管护中心苗圃基础设施建设项目。

2.项目地点：插岗梁管护中心沙滩保护站苗圃地。

3.本项目主要建设内容：

（1）苗圃地新建金属围栏（1.8m 高）1500m。

（2）苗圃新建排水渠 800m。

其中：1#排水渠（上铺夹布橡胶板）333m；2#排水渠 137m；3#排水渠 222m；4#排水渠 108m（集水井 1 座）；2#排水渠上 3 个 $\Phi 1000$ 钢筋混凝土检查井。

（3）苗圃地新建浆砌石挡土墙 700m^3 。

（4）苗圃地平整土方 1500m^3 。

4.项目投资及资金来源

项目总投资：本项目概算总投资为 78.60 万元，其中工程费用 75.00 万元，工程建设其他费 3.60 万元（设计费，监理费，招标代理费、结算审核费审、财务审计费等）；

资金来源：2026 年中央财政常态化帮扶资金（欠发达国有林场巩固提升）和单位自筹资金（单位经营性收入），其中 2026 年中央财政常态化帮

扶资金（欠发达国有林场巩固提升）75.00 万元，单位自筹资金（单位经营性收入）3.60 万元。

5.项目建设期限与进度

本项目计划 2026 年 6 月至 7 月完成项目前期设计及相关招投标工作；2026 年 8 月项目开始施工，2026 年 10 月竣工验收并交付使用，施工总工期 3 个月。

二、编制依据

《甘肃省欠发达国有林场巩固提升项目管理办法》（甘林场发【2023】144 号）

《甘肃省国有林场试点建设工作方案》（甘林场函【2024】281 号）

《插岗梁管护中心关于申报 2026 年欠发达国有林场巩固提升项目入库的报告》插管行字〔2025〕85 号

《甘肃省财政厅关于下达 2026 年中央财政常态化帮扶资金预算的通知》（甘财振兴〔2026〕7 号）

《中央财政常态化帮扶资金管理办法》（财农〔2026〕10 号）

《甘肃省财政常态化帮扶资金管理实施办法》（甘财振兴〔2026〕14 号）

《甘肃省林业和草原局关于下达 2026 年中央财政常态化帮扶资金（欠发达国有林场巩固提升）任务计划的通知》（甘林规函〔2026〕170 号）

《白龙江林业保护中心转下达 2026 年中央财政常态化帮扶资金(欠发达国有林场巩固提升)任务计划的通知》（白林规函〔2026〕13 号）

《总图制图标准》(GB / T50103—2010)

《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2019

《埋地聚乙烯排水管道工程技术规程》CECS164-2024

《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2025 年版）

国家建筑标准设计图集 23J909 《工程做法》

国家建筑标准设计图集 17J008《挡土墙（重力式、衡重式、悬臂式）》

国家建筑标准设计图集 20S515《混凝土模块式排水检查井》

其他技术性规范文件；相关法律法规及条文。

第二章 项目区概况及背景

一、项目区基本概况

1、保护区自然地理概况

甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心地处青藏高原东北边缘，岷山山系北麓，迭山山系南缘，白龙江中游甘南藏族自治州舟曲县境内。其地理坐标为东经 103° 57′ 05″ --104° 45′，北纬 33° 13′ 10″ --34° 10′ 00″ 之间，东邻陇南市武都区、西与白龙江阿夏省级自然保护区接壤，南与白龙江博峪河省级自然保护区相连，北与宕昌县接壤。

项目区所在行政区域及保护站

市（州）	县	管护中心	保护站
甘南藏族自治州	舟曲县	甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心	沙滩
			茶岗
			铁坝
			憨班

2、地形地貌

甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心除憨班保护站的部分地段位于白龙江以北的迭山山系，其余绝大部分区域被呈西北—东南走向的岷山山系所贯穿，属陆地地貌中的山地地貌类型。总体地势西高东低，最高处为沙滩保护站青山梁，海拔 4536m,最低处拱坝河口，海拔 1020m。境内地势高差悬殊，山高谷深，峰锐坡陡，地形复杂，为典型的高山峡谷区。

3、气候特征

甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心位于舟曲县境内，境内山高、坡陡、谷深，水土流失严重，属典型的高山峡谷区。年平均气温 13.2℃，最高气温 35.6℃，最低气温-8.4℃，降雨量 400-600mm。年平均日照时数 1728.6h,无霜期 223d。自然保护区气候变化较大，跨两个气候带。其中：暖温带半湿润区气候包括铁坝保护站丁字河口及憨班保护站白龙江沿岸的低海拔地带。据舟曲县气象站地面基本气象资料记载，该气候带年平均降水

量 435.8mm,蒸发量 1972.5mm,大气相对湿度为 59%, 干燥度 1.57, 年均气温 13.0℃, 最冷月平均气温(1 月)-2.2℃, 最热月平均气温(7 月)28.9℃), 全年无霜期 245.3d(最多 259d,最少 224d),日平均气温稳定, $\geq 5^{\circ}\text{C}$ 的日数 275d, 积温 4534.3℃; $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 的日数 219.4d,积温 4072.2℃, 年日照时数为 1766.3h, 日照百分比率为 40%; 温带高寒旱季显著湿润区气候: 包括沙滩、茶岗保护站的全部及铁坝、憨班保护站较高海拔的大部分林区。据甘肃省白龙江林业科学研究所沙滩气象站地面基本气象资料记载, 该气候带年平均降水量 951.0mm,蒸发量 918.8mm,大气相对湿度为 82%, 干燥度 0.52, 年均气温 4.3℃, 最冷月平均气温(1 月)-13.3℃, 最热月平均气温(7 月)20.8℃, 全年无霜期 96.7d(最多 143d,最少 53d),日平均气温 $\geq 5^{\circ}\text{C}$ 的日数约 178d,积温 1993.60℃; $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 的日数 103d,积温 1387.9℃。年日照时数为 1398.4h,日照百分比为 32%。

3、水文

甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心境内有发源于沙滩保护站的拱坝河,拱坝河穿行沙滩、茶岗、铁坝保护站,流入白龙江。全长 88.5km,总落差 1710m,流经茶岗、铁坝保护站汇入白龙江,汇水口处平均径流量为 10.123/s,年径流量为 $5.33 \times 10^8 \text{m}^3$ 。

4、土壤条件

甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心属西南高山峡谷区, 区域

内山高坡陡，地形复杂土层厚度不一，分布着不同类型的土壤。海拔 1500-1800m 以下河谷冲积地为新积土（潮土）：海拔 1500-2800m 阴坡为褐土，阳坡为栗钙土；海拔 2800-3500m 为棕壤；海拔 3500-3800m 局部为暗棕壤；海拔 3600-4200m 为高山灌丛草甸土—高山草甸土，土层普遍瘠薄，大部分地带土层厚度为 15-20cm。中切割和深切割中、高山阳坡相当一部分土层不足 15cm,还有一部分岩石或砾石裸露，土壤肥力较低。浅切割的中、高山地带土层较厚，一般大于 30cm,土壤肥力较高，有利于林木生长。

二、场址条件

1.沙滩保护站，地处甘南藏族自治州舟曲县武坪乡和插岗乡境内，东邻武都、区位优势南与九寨沟接界，距 212 国道 80 左右公里。行政上隶属甘肃省白龙江林业保护中心，地理属岷山山脉。最高海拔 4356 米，相对高差最大值 2500 米，地势陡峻，沟谷狭窄。在不同的海拔高度，依次分布着阔叶林、针阔混交林、纯针叶原始林和高山矮林等，林线之上则是高山草甸、裸岩和终年不化的雪山。雪山险峰、天然湖泊、瀑布群落等自然景观。

场地平整处苗圃地面积为 3133.90 m²，约 4.7 亩，安装金属护栏和修建排水渠处苗圃地面积为 57430.56 m²，约 86.15 亩。

2.工程地质条件

经调研，本次新建项目地基参照附近建筑物地基情况，故本设计可不需地址勘察报告。

3.电力条件

项目区的用电可与基地内供电网相接，供电方便，完全能够满足该项目施工工程中的电力需要。

4.给排水条件

本项目给水可由附近供水管网供给，供水可满足该项目基建时的给水需求。项目建设期间污水及雨水排放已与基地内排污管网相连，可满足施工期间污水排放需求。

5.电信条件



本项目的建设不影响通信工程的建设。

6.施工条件

本项目施工条件相对通畅，施工前做好安全防护，防止因施工过程中掉落存在的安全隐患；

本项目建设施工不会对周边环境构成永久性负面影响，建设区所处地理位置相对通畅、交通相对便利，便于项目施工建设。项目所用砂、石、等各种材料可在当地就近采撷，其材质状况良好，完全可以满足本项目的建设。钢材、水泥等建材可从武都区或就近两水建材市场采购。

三、项目现状照片及位置图

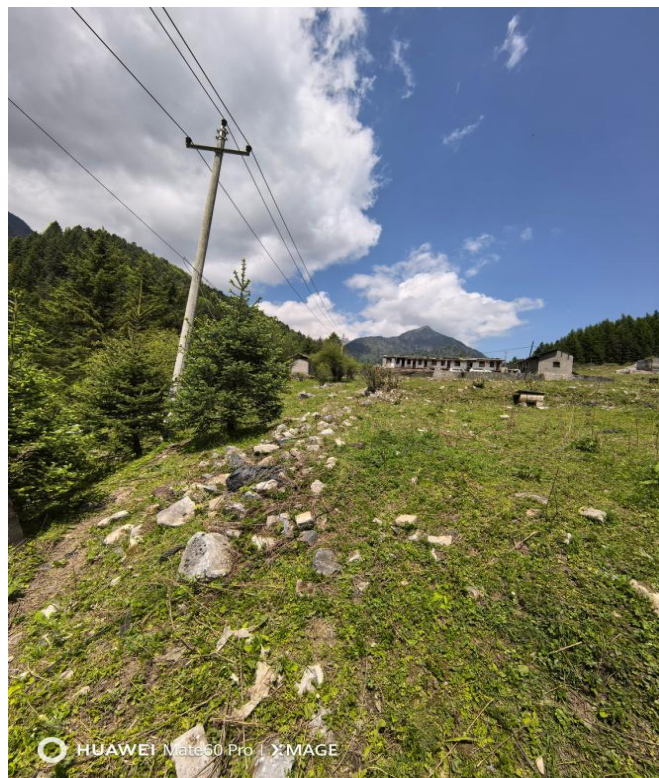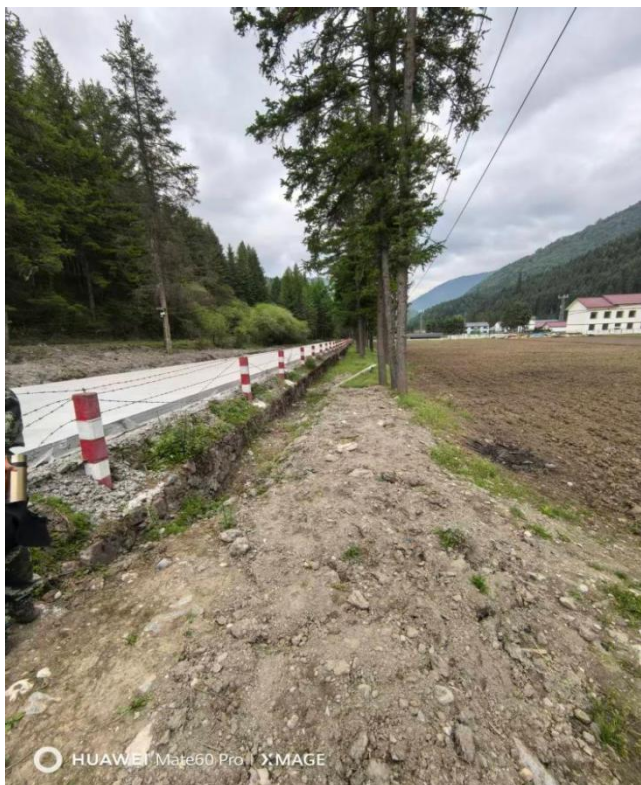





第三章 项目建设必要性及可行性

一、项目建设背景

插岗梁管护中心沙滩苗圃是插岗梁管护中心最大的育苗基地，承担着管护中心 60%的育苗生产任务，近年来由于洪涝、冰雹等自然灾害及近期防火道路施工破坏的影响，圃地积水严重，致使苗圃地土壤板结、黏重、沙化，透气性差、降雨后，雨水不能及时排出，严重影响了苗木的生长，进而影响苗圃地的经济效益。同时，苗圃防护措施破损和浆砌石坍塌，破坏了苗圃地的完整性，无法保护家禽及野生动物对苗圃地破坏，也给育苗生产人员的生命安全造成了威胁，严重影响苗圃地的经济效益和可持续发展。鉴于此，急需对苗圃地排水设施、防护措施等基础设施进行完善，

项目现状见以下项目现状照片。

二、项目建设必要性

项目实施苗圃地因表面雨水不能及时排出，导致苗木根系受损，苗木出圃率下降，苗木为改善苗圃地土壤的种植活力，提高苗圃地种植产量，实现苗木收益及苗圃地可持续发展急需对苗圃地排水设施进行改良。苗圃地原有浆砌石、混凝土挡坎年限已久，在常年雨水冲刷及气候冻胀的作用下大部分已垮塌，已破坏了苗圃地的完整性，为更好的保护苗圃地需要新建浆砌石挡土墙、平整土地；现有苗圃地大多数未设置防护设施，为防止牲畜和野生动物对苗圃地苗木的破坏急需设置防护措施，苗圃地原有的防护措施和苗圃地防护措施已使用多年，在牲畜和野生动物及近期实施防火道路项目的破坏下已不具备防护功能，为更好的保护苗圃地苗木急需对已破坏的防护措施进行改造。

三、建设的可行性

（1）本项目的建设满足国家和省林草局对国有林场建设政策及资金使用要求，也满足林场及管护中心可持续发展的需求，在政策上可行。

（2）本项目位于沙滩保护站营林段和场部附近，交通便利，建设内容同林区保护无冲突，对林区植被没有破坏，在建设条件上可行。

（3）本项目所在场地地势平坦，无重大灾害影响，在施工安全要求上满足施工条件。

四、结论与建议

1.结论

通过对项目建设的必要性，工程实施的可行性进行认真的分析论证，本实施方案认为：

项目建设符合国家、省、州以及地方政府的政策，是贯彻落实相关政策文件的体现从建设条件分析，项目地理区位交通方便，水、电、通讯等基础设施较为完善，项目地址条件良好。

从工程技术上分析，项目的建设规模及内容符合实际需要，项目建设方案符合国家相关的设计标准。

从环境保护方面分析，本项目在建设期间对环境的影响可通过人为有效管理后对环境影响可忽略不计。

从社会效益分析，通过本项目建设可以有效提高苗圃地的经济效益和林场的可持续发展。

综上所述，2026 年欠发达国有林场巩固提升任务插岗梁省级自然保护区管护中心苗圃基础设施建设项目技术、社会效益等方面具有建设的必要性和实施的可行性。

2.建议

为确保项目建设的顺利实施，本实施方案提出以下建议：

（1）项目建设单位和政府相关部门及时办理相关手续，确保项目进展

顺利，以便组织尽早实施；

(2) 建设单位抓紧完成工程建设前期工作，为确保项目下阶段工作顺利开展，切实加强项目统筹计划的直辖管理；

第四章 项目效益分析

一、生态效益

项目新建围栏、排水渠、挡土墙及场地平整，有效解决苗圃积水、土壤板结、水土流失、边坡坍塌等问题，改善苗木生长环境，提高苗木成活率。完善育苗保障能力，可为自然保护区及周边林场生态修复、荒山造林提供优质苗木，增强水源涵养、水土保持与生物多样性保护功能。围栏阻隔牲畜和野生动物破坏，排水、挡护工程降低洪涝和地质灾害风险，提升林区生态防灾能力。

二、社会效益

落实欠发达国有林场巩固提升政策，补齐苗圃基础设施短板，提升林场育苗标准化水平。施工吸纳当地务工，增加群众收入；依托苗圃开展技术实训，培育本地林业技术力量。项目建设模式可作为区域同类苗圃改造示范，支撑国土绿化、公益林管护等生态公益事业，筑牢白龙江流域生态安全屏障。

三、经济效益

完善基础设施后，减少苗木水淹、损毁损耗，提高出圃率，降低育苗成本。盘活苗圃土地资源，扩大优质苗木产能，富余苗木可调剂外销，增

加单位经营收入。新建设施耐用性强，大幅减少后期维修翻新费用，实现节支增收、国有资产保值增效。

四、可持续效益

本项目配套设施结构稳固、使用寿命长，结合常态化管理机制，可长期维持苗圃良好生产条件，持续为区域生态建设供给优质苗木。标准化运营模式推动苗圃生产、设施管护、资产利用形成良性循环，不断夯实林场发展根基，助力林业产业与生态保护事业长效、稳定发展。

第五章 后续资产管护

一、项目后续管护

管护主体：由甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心沙滩保护站负责日常管护，定岗定人、责任到人。

管护内容

金属围栏：定期巡查、除锈防腐，及时修复破损、倒伏，保持完整防护功能。

排水渠及检查井：汛前汛后清淤疏通，检查渠体、管道、井体结构，确保排水畅通。

浆砌石挡土墙：常态化巡查勾缝、砌体、泄水孔、变形缝，及时修补破损、疏通泄水孔。

平整场地：维持设计排水坡度，及时修整冲刷低洼处，保障无积水、

土质稳定。

管护制度：建立日常巡查、汛期加密巡查、灾后专项巡查制度；实行零星破损即时维修、建档台账管理。

管护经费：日常管护经费纳入单位年度事业预算，重大维修按程序申请专项资金。

二、资产管护

资产确权登记：项目竣工验收后，及时盘点清查，将围栏、排水渠、挡土墙、场地设施全部纳入国有固定资产台账，权属清晰、账实相符，归管护中心统一管理。

日常资产管理：设专职资产管理员，每年开展资产清查盘点；严禁私自占用、拆除、变卖国有资产，确需调整须按程序报批。

资产保值增值：常态化养护延长设施使用寿命，降低折旧损耗；充分发挥苗圃育苗功能，提升资产使用效益。

报废处置：设施超期或无法修复时，按规定技术鉴定、逐级报批，规范残值处置，收入按财政规定统筹管理。

第六章 保障措施

一、保障措施

（一）组织保障

成立项目建设领导小组，明确建设、设计、施工、监理各方职责，实

行专人统筹、定期调度，协调解决手续、施工、现场协调等各类问题。

（二）资金保障

项目资金实行专户管理、专款专用、单独核算，中央帮扶资金与单位自筹资金足额到位。严格按进度和合同拨付工程款，规范结算审计、财务审计，接受财政、审计、林草部门监督，杜绝截留挤占挪用。

（三）技术保障

设计单位全程提供图纸交底、现场技术指导；监理全程质量管控，严把原材料、工序、隐蔽工程验收；施工单位设专职质检员，严格按照规范及标准图集施工，确保工程质量达标。

（四）安全与施工保障

合理安排工期，2026 年 8—10 月组织施工，确保 3 个月按期竣工。落实安全生产责任制，规范现场防护作业；严格林区火源管控，专人值守防火，严防森林火灾。坚持绿色文明施工，弃土、垃圾集中清运，洒水降尘，保护林区植被与生态环境。

施工方式：由建设单位组织实施，建设单位进行监督检查，聘请信誉好、负责任的专业工程监理公司，对施工过程进行全程监理，确保建设质量和工期。

施工组织：建设单位成立项目建设工作领导小组，专人负责施工。作业前由施工方准备好所需的物资、劳力和机械等，安排在无雨季进行施工。

施工过程中施工单位必须严格按施工图纸、国家现行有关标准和规范施工。工程质量检验评定统一标准等文件及双方确认的施工组织设计，精心施工、记录、检验，通过健全质量保证体系和检查制度，严格把好每道工序的质量关，以确保全部工程达到良好的质量。

施工地点位于沙滩保护站场部附近，交通便利，所需物资均可由车辆运输至施工作业地点。

（五）制度保障

严格执行项目法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制、竣工验收制，健全质量、进度、资金、现场、档案管理制度，全过程规范实施，资料完整归档备查。

（六）运维长效保障

将设施管护纳入单位常态化工作，落实人员、制度、经费，建立长效运维机制，做到建成即管好、长期稳定发挥效益。

第七章 保障措施

一、项目管理

在项目前期及建设过程中，实行合同管理，严格按照项目法人制，建立施工监理制度，严格执行工程建设标准，做到建管并重。加强对项目的施工进度、投资和质量的控制，制定有关合同管理、资金管理及全面的组织协调，达到最优的投资和最好的工程质量，并获得良好的经济效益和社会

会效益。

1、质量管理

针对基础设施建设项目，应始终建设高标准、高质量作为终极目标，要从各方面加强质量控制和管理。在工程的设计、施工、验收中，要严格执行我国现有各类规范、规程及法规。要建立和健全质量保证体系，使质量管理工作制度化，要聘请施工监理，督促施工单位设专职质检员。建立施工监理跟踪检验制度，隐蔽工程验收制度和质量一票否决制度。

2、进度管理

本项目进度管理应制定合理科学的进度计划、进度目标、任务清单，成本与资源的合理配置，应充分考虑进度风险与缓冲时间。为顺利按时保质保量完成项目任务，应及时安排专人动态跟踪，发现问题及时沟通解决。

3、合同管理

合同管理贯穿于合同的选择、合同谈判、履行、合同期满直至归档全过程。为保证施工承包合同的严密性，认真对待每一个合同的谈判。在决标后留出一定的时间，要求承包商提交相关详细资料，作为合同的一部分，防止以不正当手段牟取利益。对于项目合同选用专人负责，实行全过程合同管理，使得每个分项工程都处于有效的控制之下。严格按照合同办事，保证合同执行的严肃性。项目财务受政府和社会有关部门的监督。

4、资金管理

为使本项目顺利保质保量完成，项目资金应由建设单位专人管理，管理人员应及时和施工单位，监理单位沟通，在满足工程进度款拨付要求后，应及时拨付进度款项，不得超付或恶意扣留工程进度款项，待项目完成后建设单位应及时组织相关单位对项目进行验收，验收通过后应及时组织后续审计工作，待程序合法合理的情况下及时向施工单位拨付工程剩余款项。

5、现场管理

工程建设期间，将会多个工作面同时施工，形成联合作战的格局。要确保施工现场有条不紊、文明施工。要坚持以系统、合理、可行的原则，加强现场管理，组织科学文明施工。根据不同施工阶段制定不同的总平面图，以总平面图为依据检查各工作面文明施工的落实情况。对出入施工现场的人员，要制定相应的管理制度作为基本行为准则，在现场要采取有效的保卫措施和严格的检查监控，保证施工现场人员的管理得到有效的控制。

二、公示公告

（一）公示范围

项目实施全过程严格执行政务公开要求，在甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心办公区、沙滩保护站公示栏及单位内部工作平台进行公示，主动接受干部职工、林区群众及社会各界监督。

（二）公示内容及时段

前期公示：项目立项批复、建设内容、投资规模、资金来源、招投标

信息，在招标工作启动前完成公示，公示期不少于 5 个工作日。

施工公示：施工单位、监理单位、项目负责人、施工工期、现场监督联系方式，施工期间长期公示。

竣工公示：工程完成情况、验收结果、资金使用情况、资产移交情况，竣工验收后公示，公示期不少于 5 个工作日。

（三）公示管理

安排专人负责公示内容发布、留存及意见收集。公示期间设立监督电话和意见箱，对收到的异议、建议及问题逐一核实、登记、反馈，做到事事有回应、件件有落实，保障项目公开、透明、规范实施。

三、绩效管理

（一）、绩效目标设定

产出绩效：保质完成 1500m 金属围栏、800m 排水渠、700m³ 浆砌石挡墙、1500m³ 场地平整全部建设内容，工程验收合格率 100%，2026 年 9 月初按期竣工交付。

效益绩效：改善苗圃积水、水土流失问题，苗木成活率、出圃率明显提升；增强苗圃防灾防护能力，带动周边群众就近务工、学习育苗技术，群众满意度≥90%。

成本绩效：严格控制总投资 78.6 万元，其中财政帮扶资金 75 万元、自筹 3.6 万元，不超概算、不挤占挪用专项资金。

（二）绩效监控机制

专人动态监控：由项目负责人张鹏牵头，建立月度绩效台账，对照产出、时效、成本指标逐项核对进度、工程量、资金支出。

进度与资金双监控：每月梳理施工完成量与资金支付进度，若支出滞后、工程进度缓慢，及时调整施工组织、加快支付流程，避免资金沉淀、绩效滞后。

现场绩效核查：监理、管护中心定期现场核查已完工程数量、质量，留存影像、工程量记录作为绩效佐证资料。

（三）绩效运行管控措施

全过程资料留存：招投标（政府采购）资料、施工记录、监理日志、影像资料、验收报告、结算审计资料统一归档，作为绩效评价依据。

问题整改闭环：绩效监控发现工程量不足、质量缺陷、资金拨付不规范等问题，限期整改并复核销号，形成“发现—整改—复查”闭环管理。

联农带农绩效跟踪：单独统计本地务工人数、劳务支出、本地建材采购金额、农户技术培训人次，单独台账体现联农带农绩效成效。

（四）绩效自评与评价应用

竣工后及时开展项目绩效自评，对照绩效目标表逐项打分，撰写绩效自评报告，同步上报白龙江林业保护中心及省林草局。

绩效评价结果作为后续同类帮扶资金申报、林场项目安排重要依据；绩效未达标事项梳理成因，形成长效整改措施，纳入林场项目管理制度。

（五）绩效长效管护

项目完工后持续开展年度绩效跟踪，每年统计苗圃育苗产量、苗木外销收入、设施维修成本、生态改善成效，持续考核生态、经济、可持续效益，保障帮扶资金长期发挥效益。

第八章 建设内容

一、设计规模及内容

（1）苗圃地新建金属围栏（1.8m 高）1500m。

（2）苗圃新建排水渠 800m。

其中：1#排水渠（上铺夹布橡胶板）333m；2#排水渠 137m；3#排水渠 222m；4#排水渠 108m（集水井 1 座）；2#排水渠 3 个 Φ 1000 钢筋混凝土检查井。

（3）苗圃地新建浆砌石挡土墙 700m³。

（4）苗圃地平整土方 1500m³。

二、建筑设计说明

1.苗圃地新建金属围栏（1.8m 高）

本金属围网单跨长度为 4000mm，总高度 1800mm，利用原混凝土立柱 +

角钢边框 + 金属围网的组合形式。地面以上露出高度为 1800mm；立柱间距 4000mm。立柱上采用 L40*50 不等边角钢作为边框骨架，角钢骨架高度 1800mm，通过 M6*20*50 膨胀螺栓与混凝土立柱固定。角钢骨架之间安装金属围网，形成整体防护结构。

本项目 1500m 金属围栏全部利用原有混凝土立柱，经现场勘查：立柱基础稳固、无沉降断裂，4m 间距与围栏模数匹配；仅表层轻微风化，无结构性病害，混凝土密实可直接膨胀螺栓锚固。施工前清理修补表层缺陷，金属配件统一防腐，原有立柱承载力完全满足防护使用要求。

2. 苗圃新建排水渠

1#排水渠采用倒梯形断面，渠顶宽 1200mm，渠底宽 500mm，渠高 600mm。渠底设置 DN30 双壁波纹管，穿孔排水管，管道外侧用透水土工布包裹，管道上半部分（3/2 以上区域）打孔，孔径 3-5mm，孔间距 3-5cm；管道周围填充中粗砂，砂层厚 400mm。砂层以上依次设置 100mm 厚砾石层、100mm 厚碎石层，顶部设 10mm 厚塑胶板封盖。

2#排水渠采用倒梯形断面，DN400 双壁波纹管沟槽采用梯形断面施工，沟槽总深度 800mm，顶部宽度 1000mm，底部宽度 600mm；施工时先在槽底铺设厚度为 100mm、宽度为 600mm 的砂垫层，再将 DN400 双壁波纹管居中铺设于砂垫层上，管周及管顶以上至沟槽顶部采用素土分层回填夯实，其中管顶以上回填厚度为 300mm，形成完整的梯形回填断面。

3#土质排水渠采用梯形土质明渠断面，渠顶宽 900mm，渠底宽 600mm，渠深 800mm，渠壁为原土成型，不做衬砌，按设计坡度和断面尺寸开挖成型，施工时需保证渠底、渠壁平整，边坡稳定，防止冲刷坍塌。

4#排水渠采用倒梯形盲沟断面，沟槽总深度 800mm，顶部宽度 800mm，底部宽度 600mm；施工时先在槽底铺设厚度为 100mm、宽度为 600mm 的砂垫层，再将 DN200 双壁波纹管居中铺设于砂垫层上，管周及管顶以上至沟槽顶部采用素土分层回填夯实，其中管顶以上回填厚度为 300mm，形成完整的梯形回填断面。

集水井为现浇钢筋混凝土矩形结构，做法如下：地基采用原土夯实，压实系数 $\geq 90\%$ ，上设 100mm 厚天然级配碎石垫层，垫层上浇筑 200mm 厚 C25 混凝土底板；井壁现浇混凝土，壁厚 200mm,内净宽 400mm，井壁高度自底板顶面至室外地面为 800mm；井壁设置两道 DN200 双壁波纹管进水口，下口中心距底板顶面 200mm，上口中心距底板顶面 600mm，用于接入场地排水。

3. 苗圃地新建浆砌石挡土墙：

苗圃地新建浆砌石挡土墙，做法参见浆砌石做法：（1、浆砌石下地基须原土强夯实，地基承载力不应小于 180Kpa，（2、浆砌石用 M7.5 水泥砂浆砌筑，并应砂浆满铺，浆砌石内不应留有孔洞，（3、浆砌石内回填土应分层夯实，不应一次回填，夯实系数不小于 0.94，（4、砌筑时石材强度等

级不小于 MU30、厚度不小于 15cm,砂浆强度等级不小于 M7.5, (5、浆砌石每隔 10 米需设置变形缝一道,变形缝宽 20mm,高度与浆砌石同高,变形缝两侧用混凝土强度等级为 C15 的砌块砌筑, (6、泄水孔的尺寸为 10PVC 圆孔,孔眼间距为 2~3m、上下、左右交错设置,泄水孔洞口前宜用粗砂石骨料渗水,浆砌石顶和浆砌石底标高处宜铺设粘土防水层, (7、施工时必须确保重力式浆砌石趾前土的厚度,并要求夯填密实, (8、未尽事宜参照 17J008 挡土墙重力式、衡重式、悬臂式挡土墙标准图集执行。

4. 苗圃地平整土方

对苗圃施工区域进行场地清理,清除场内杂草、树根、杂物、淤泥及不合格土层。根据设计标高及排水要求进行土方挖填、找平及修整,合理进行土方调配。土方回填分层平整、夯实,场地整体按设计排水坡度修整平顺,确保场地平整、坡度顺畅、无积水低洼区域,土质均匀密实,满足苗木种植、场地排水及后期管护施工要求。

第九章 环境影响评价

环境保护是我国的基本国策,在建设的过程中要防止引起二次污染,尤其应贯彻环境保护措施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用原则,遵照《建设项目环境保护设计规范》,完成本项目环境保护与监测的项目咨询与设计。

一、编制依据

《中华人民共和国环境保护法》2014 年修订

《建设项目环境保护管理条例》2017 年修订版（国务院令第 682 号）

《建设项目环境保护管理条例》（2017 修订）

《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70 号）

环境保护有关标准

《大气环境质量标准》(GB 3095—2026)二级

《地面水环境质量标准》(GB 3838—2002)II 类

二、环境保护

1、建设项目的环境要求

本项目在建设使用过程中，只有少量的建筑垃圾、生活垃圾。生活垃圾收集送至乡镇的垃圾处理场集中处理。生活废水排入乡镇排水沟，对周围环境不应产生二次污染或对周围环境污染不超过国家有关法律法规和现行标准禁止的范围，并且应当与当地的大气防护、水资源保护、环境生态保护及生态平衡要求相一致，不引起空气、水和噪声的污染，不危害公共卫生。因此，环境的保护是必要的。

2、建设过程中的环境保护措施

项目施工过程中，车辆的进出、材料的运输等，尽量避开交通高峰期，躲开狭窄路段。

弃土随挖随清，合理利用场地，不占交通道路。

易起扬尘天气或对干燥弃土要随时洒水降尘，散落路面的泥土要即使清理，减少环境污染。

对现场施工人员应加强教育，不随便乱丢废弃物，及时清理施工现场的生活废弃物，并妥善处理，保证工人工作环境的卫生质量。

3、水污染影响及控制措施

该区域无渗沥水，不会直接或间接污染临近地表水及地下水。

4、大气污染影响及控制措施

该区域无大气污染。

5、对蚊蝇害虫的防治措施

每天产生的垃圾及时清运，及时清除场区内坑洼积水，减少蚊蝇的滋生地。

对场外带进或场内产生的蚊蝇鼠类带菌体，一方面组织人员定期喷药，另一方面加强市场管理及时清运散落垃圾。

三、环境影响评价

（一）项目场址环境现状

本项目位于沙滩保护站，场地环境条件良好，适宜本项目建设。

（二）项目建设期与使用期对环境的影响

本项目的污染产生在建设过程中。

1、项目建设期对环境的影响

(1) 大气污染物。主要是场地开挖、余土装运等施工过程中产生的建设扬尘以及运输车辆排放的尾气。

(2) 噪声。本项目位于林区噪音小可忽略不计。

(3) 固体废弃物。主要是来自施工过程中弃、余土，废弃砖石，混凝土碎块及其它建筑废弃物，还包括一部分生活垃圾。

(4) 污水：主要是施工用水排放和施工机械产生的含油废水，以及施工人员生活污水等。

2、项目使用过程中对环境的影响

本项目建成后使用过程中，不存在严重污染源排放的问题，此时，周边环境系统已经形成，其主要环境污染因素有：粪便，粪便可作为苗圃地苗木的施肥，因而不存在粪便的污染。

四、环境保护措施

针对本项目建设对环境的影响，项目建设过程中应严格管理生活和建筑垃圾随意丢弃堆积，应集中收集统一带离施工现场，应严禁随意乱挖乱伐，保护森林植被不被破坏；生活废水或机械产生的含油废水应集中分类处理，保护环境不被污染。

五、环境影响评价结论与建议

项目所在地环境质量现状良好，水、空气及声环境质量都达到了国家规定的标准。项目建成后，基本不产生空气污染和噪声污染，综上所述，

本项目对环境的污染程度一般，如果建议的防治措施能够付诸实施，在施工期和使用期对环境的不利影响可以降到最低程度。

第十章 项目建设期限与进度安排

一、实施计划

本项目计划 2026 年 6 月至 7 月完成项目前期设计及相关招投标工作；
2026 年 8 月项目开始施工，2026 年 10 月竣工验收并交付使用，施工总工期 3 个月。

序号	工作内容	计划工期	2026 年 6 月	2026 年 7 月	2026 年 8 月	2026 年 9 月	2026 年 10 月
1	项目设计、报批及招投标	6—7 月	■■■■■	■■■■■			
2	场地清理、土方平整	8—9 月			■■■■■		
3	排水渠、检查井、集水井施工	8—10 月			■■■■■	■■■■■	
4	浆砌石挡土墙砌筑	8—10 月			■■■■■	■■■■■	■■■■■
5	金属围栏安装	8—10 月			■■■■■	■■■■■	■■■■■
6	现场收尾、自检整改	10 月					■■■■■
7	竣工验收、交付使用	10 月					■■■■■

第十一章 项目招投标

一、法律适用依据

本项目实施单位为事业单位，资金为 2026 年中央财政常态化帮扶财政资金，概算总投资 78.60 万元，工程施工费 75 万元。依据《必须招标的工程项目规定》（国家发改委 16 号令），施工单项 400 万元、服务 100 万元方达到依法强制招标门槛，本项目各分项合同金额均未达到法定必须招标限额，不适用《招标投标法》，全程执行《甘肃省财政厅关于印发《甘肃省政府采购目录及标准(2025 年版)》的通知》甘财采[2024]10 号及其实施条例，按照政府采购小额项目流程实施采购。

二、采购实施方式

施工、设计、监理、招标代理、结算审计全部纳入政府采购管理范畴，采用市场询价、竞争性磋商等政府采购合规方式组织，不进入公共资源交易中心强制招投标流程。

严格遵循政府采购内控、公示、评审、合同、资金支付全流程管理，落实财政资金监管、绩效管控要求。

采购全过程在管护中心公示栏、内部平台公示采购需求、候选单位、成交结果，接受干部职工与社会监督，留存全套政府采购档案备查。

三、采购管理要求

建立政府采购台账，完整留存询价文件、报价资料、评审记录、成交确认书、采购合同等全套资料。

资金拨付、结算审计严格按照财政与政府采购配套管理规定执行，专

款专用，主动接受财政、审计、林草部门监督检查。

落实政府采购风险防控，规范供应商选取，杜绝规避采购程序、拆分项目等违规行为。

第十二章 风险分析

一、风险因素分析

本项目为林场苗圃地建设项目，属于小型建设项目，根据项目特点，本项目存在风险主要有以下两项：

1、关于环境影响问题。从现场调查的情况看，本项目的建设对环境影
响主要为建筑垃圾和施工单位生活垃圾。

2、关于工程管理风险。本项目所在地位于国有林场，与当地居民不存在交集，工程管理相对单一，唯一风险及主要风险是对施工人员在生活中对火源的管控，即预防森林火灾。

二、风险防范和化解措施

（一）环境安全防范措施

根据项目所在地实际情况，环境安全防范即有效指导施工人员在施工和生活过程中严禁随意丢弃生活或建筑垃圾，所有垃圾应统一收集，待项目完成后集中带离项目区。

（二）工程管理风险防范措施

本项目所在地位于国有林场林区，为预防森林火灾发生，应严禁使用

烟火，施工人员在施工或者生活中若不可避免使用火源，应严格按照林区防火制度使用，施工单位应安排专人负责监管施工人员用火需求，以有效预防森林火灾发生。

第十三章 投资概算及资金来源

一、工程概况、规模及范围

本项目为2026年欠发达国有林场巩固提升任务插岗梁省级自然保护区管护中心苗圃基础设施建设项目。建设地址插岗梁管护中心沙滩保护站苗圃地；建设内容分别是：（1）苗圃地新建金属围栏（1.8m高）1500m。（2）苗圃新建排水渠800m。其中：1#排水渠（上铺夹布橡胶板）333m；2#排水渠137m；3#排水渠222m；4#排水渠108m（集水井1座）；2#排水渠上3个Φ1000钢筋混凝土检查井。（3）苗圃地新建浆砌石挡土墙700m³。（4）苗圃地平整土方1500m³。

二、编制依据

1、依据《2026年欠发达国有林场巩固提升任务插岗梁省级自然保护区管护中心苗圃基础设施建设项目》方案设计以及相关专业说明编制。

2、《甘肃省建设工程设计概算编制审核办法》甘建价【2010】546号文；《建设项目设计概算编审规程 CECA/GC-2023》以及《甘肃省建设工程计价规则 DBJD25-98-2022》；

3、现行《甘肃省市政工程预算定额》（2018）、《甘肃省建筑与装饰

工程预算定额》(2019 地区基价)、《甘肃省安装工程预算定额》(2019 地区基价)及合作地区基价；

4、工程建设其他费用根据《甘肃省工程建设其他费用项目组成及有关文件汇编》及相关文件。

5、工程施工监理费按发改价格【2007】670 号文件执行。

6、工程勘察设计收费按计价【2002】10 号文执行。

7、工程预算编制费及工程结算审核费按照甘价协(2022)32 号文执行。

8、税金记取依据甘建价【2019】118 号文。

9、材料市场价格执行舟曲县第六期信息价调整，人工市场价格执行合作市第六期信息价调整。

10、《关于放开建设项目服务价格的通知》发改价格〔2015〕299 号文。

三、项目投资概算及资金来源

本工程概算总投资为 78.60 万元，资金来源为 2026 年中央财政常态化帮扶资金（欠发达国有林场巩固提升）资金 75.00 万元，其余为建设单位自筹。

四、投资概算表

序号	名称	投资额（万元）	占投资比例（%）	备 注
一	工程费用	75.00	95.42	
二	工程建设其他费	3.60	4.58	
三	概算总投资	78.60	100.00	

第十四章 附件

- 1、附件 1 《插岗梁管护中心关于申报 2026 年欠发达国有林场巩固提升项目入库的报告》插管行字〔2025〕85 号
- 2、附件 2《关于补充申报中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-欠发达国有林场巩固提升任务 2026 年项目的通知》
- 3、附件 3 《甘肃省财政厅关于下达 2026 年中央财政常态化帮扶资金预算的通知》甘财政兴（2026）7 号
- 4、附件 4 《甘肃省林业和草原局关于下达 2026 年中央财政常态化帮扶资金（欠发达国有林场巩固提升）任务计划的通知》（甘林规函〔2026〕170 号）
- 5、附件 5 《白龙江林业保护中心转下达 2026 年中央财政常态化帮扶资金（欠发达国有林场巩固提升）任务计划的通知》（白林规函〔2026〕13 号）
设计图纸。
概算书。

甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心文件

插管行字〔2025〕85号

签发人：何世刚

插岗梁管护中心关于申报 2026 年 欠发达国有林场巩固提升项目入库的报告

白龙江林业保护中心

根据《甘肃省林业和草原局关于补充申报中央财政衔接推进乡村振兴补助资金一欠发达国有林场巩固提升任务 2026 年项目的通知》《欠发达国有林场巩固提升任务 2026 年项目补充申报指南》要求，我管护中心高度重视，结合林区发展建设实际情况，拟申报 2026 年欠发达国有林场巩固提升项目 2 个。

现随文呈报，请审示。

附件：1. 2026 年欠发达国有林场巩固提升插岗梁管护中心

- 乡土树种容器苗培育项目（包括文本、绩效目标表）
2. 2026 年欠发达国有林场巩固提升插岗梁管护中心
苗圃基础设施建设项目（包括文本、绩效目标表）
3. 插岗梁管护中心欠发达国有林场巩固提升任务
项目入库申报表
4. 插岗梁管护中心欠发达国有林场巩固提升任务项
目因素测算表

甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心

2025 年 9 月 5 日



抄送：保护中心造林处，本管护中心主任、分管副主任，规财科、造林科。

插岗梁管护中心办公室

2025 年 9 月 5 日印发

附件：1

中央财政欠发达国有林场 巩固提升任务资金项目申报文本

项目名称：2026 年欠发达国有林场巩固提升插岗梁管护中心

苗圃基础建设项目

项目性质：非经营性项目


项目属性：改建

资金类别：财政拨款

项目申报单位：甘肃省白龙江林业保护中心

申报日期和文号：

项目实施单位：甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心



项目申报书

项目名称	2026 年欠发达国有林场巩固提升插岗梁管护中心苗圃基础建设项目
项目性质	非经营性项目
资金类别	财政拨款
项目属性	改 建
申请金额	75 万元
项目实施单位	名 称：甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心
	法人代表：何世刚 联系电话：13993950329
	开户银行：甘肃银行股份有限公司陇南分行
	银行账户：61012900200018734
申请理由及实施方案：	

立项依据：

插岗梁管护中心被确定为甘肃省“三北”地区种苗基地试点类型林场，沙滩保护站苗圃是管护中心最大的育苗基地，承担着管护中心 50% 的育苗生产任务。近年来由于沙滩保护站雨水过多，洪涝灾害频繁，致使常年受雨水冲刷及气候冻胀作用下的石墙出现了大面积裂缝和垮塌，垮塌处土层变薄，养分、有机质流失严重，严重影响了育苗生产。虽然管护中心争取资金，进行了维修，但由于资金有限，只完成了少部分，没有真正起到保护苗圃、培育优质苗木的作用。所以，急需对垮塌苗圃地石墙进行加固和维修。

项目预期目标：

计划维修沙滩保护站石墙 1500 立方米。通过开展苗圃基础建设工作，提高苗圃抵抗自然灾害的能力，为以后生态用苗提供强有力的保障，还可以促进植物多样性保护和维护生态平衡。

项目实施地点及范围：

该项目实施地点在插岗梁管护中心沙滩保护站。苗圃地处保护站部周围，一条护林管护主干道从苗圃中间穿插而过，交通便利，运输方便，水、电、路齐全，条件良好。

项目建设内容及实施计划：

沙滩苗圃基础建设工程，加固维修苗圃地石墙 1500 立方米，实施计划：前期准备阶段（2026 年 1 月-3 月）；施工阶段（2026 年 4 月-8 月）；检查验收阶段（2026 年 9 月-10 月）；项目结算阶段（2026 年 11 月-12 月）。

项目资金预算：

该项目投资 75 万元。资金筹措全部来源于中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

项目成效：

通过维修沙滩保护站苗圃石墙，可以提高苗圃抵抗自然灾害的能力，为以后生态用苗提供强有力的保障。同时，可以改善生态环境，促进生物多样性保护，实现苗木收益，增加职工和当地群众收入，达到共同致富目的。

项目
实施
单位
责任



项目实施单位负责人对
报告准确性、真实性负责

2025 年 9 月 4 日

法人代表（签字）


2025 年 9 月 4 日

甘肃省林业和草原局

关于补充申报中央财政衔接 推进乡村振兴补助资金-欠发达 国有林场巩固提升任务 2026 年项目的通知

各有关市（州）林业和草原局，省白龙江、小陇山林业保护中心：

为提升欠发达国有林场巩固提升任务 2026 年项目建设的针对性、实效性，根据《甘肃省欠发达国有林场巩固提升项目管理办法》相关规定，现就做好补充申报中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-欠发达国有林场巩固提升任务 2026 年项目有关工作通知如下：

一、项目申报内容

本次补充申报以《甘肃省林业和草原局国有林场和种苗管理建设项目三年计划实施方案（2024-2026 年）》为基础，对三年计划实施方案中欠发达国有林场巩固提升任务 2026 年项目进行补充。

（一）项目申报对象和年度。本次补充申报对象为欠发达国有林场，申报年度为 2026 年。

（二）项目申报重点。申报项目重点要侧重于国有林场试点建设、“三北”工程种苗保供和中药材种植等建设重点任务。

（三）支持范围。重点支持国有林场试点建设、“三北”工程种苗保供和中药材种植，优先支持国有林场发展优势产业，补齐必要的基础设施短板，**一是**支持国有林场发展林下种养业、探索林果、林药、林菌、林苗、林花、林蜂等多种森林复合经营模式；**二是**支持国有林场培育林草良种和优良乡土树种，提升国有林场苗圃基础建设和生产能力；**三是**支持国有林场提升森林康养、森林体验、自然教育等国有林场范围内森林公园基础条件；**四是**支持国有林场补齐必要的配套基础设施建设短板。申报建设内容严禁出现单位基本支出、购买或租赁交通工具及通讯设备、修建楼堂馆所、大中型基建项目、发放各种奖金津贴和福利补助、偿还债务、垫资或回购、注资企业、设立基金、弥补企业亏损、城市相关支出涉及“负面清单”内容，项目申报内容要规避《甘肃省林业和草原局中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-欠发达国有林场巩固提升任务项目全流程规范化管理实操手册》（以下简称《实操手册》）和财政部门明确的预警字样。

二、项目申报程序

（一）国有林场申报。由欠发达国有林场结合本单位发展建设需求，严格按照《甘肃省欠发达国有林场巩固提升项目管理办法》《实操手册》和项目补充申报指南（附件1）、

申报标准文本及填写说明（附件 1-1、1-2）和因素测算表填写说明（附件 4-1）相关申报标准、流程和具体填写要求，自主确定 2026 年欠发达国有林场巩固提升任务计划，明确项目建设内容、数量和资金需求，做好项目申报材料填报。

（二）国有林场主管部门审核。国有林场主管部门按照相关要求审核把关，确保入库项目可操作性和申报资金合理性。

（三）市级林草部门把关。市级林草部门要加强指导，结合国有林场发展建设实际，严格把关、综合衡量，汇总报送补充申报项目及申报材料；省属国有林场自主确定申报项目，由保护中心国有林场主管部门按要求和程序审核把关，组织申报。省林草局将组织专家对补充申报项目进行论证，按要求择优录入“全国林业和草原财政资金信息管理系统”。

三、项目申报要求

（一）提高认识。各地各单位要高度重视，积极组织申报工作。项目申报结合国有林场发展规划合理谋划；各国有林场要深入调研、论证，确保项目的科学性、可操作性。

（二）科学申报。申报计划要符合建设实际需求，克服“贪大求全”、“报大批少”的观念。省局将对申报计划进行合理性审核，并组织专家论证，凡不具备实施可能性的项目不予入库。

（三）按时报送。各地各单位请于 2025 年 9 月 10 日前，

将申报正式文件及相关表格通过 OA 系统报送省林业和草原局；表格电子版发送至指定邮箱（2121942628@qq.com）。

联系人：曹官保 联系电话：18419199427

附件：1. 欠发达国有林场巩固提升任务 2026 年项目补充申报指南

1-1. 中央财政欠发达国有林场巩固提升任务资金项目申报标准文本

1-2. 《中央财政欠发达国有林场巩固提升任务资金项目申报标准文本》填写说明

2. 甘肃省欠发达国有林场巩固提升任务项目入库申报表

3. 欠发达国有林场巩固提升任务项目绩效目标表

4. 欠发达国有林场巩固提升任务项目因素测算表

4-1. 因素测算表填写说明



甘肃省财政厅文件

甘财振兴〔2026〕7号

甘肃省财政厅关于下达 2026 年中央财政 常态化帮扶资金预算的通知

有关市（州）财政局，兰州新区财政局，有关省直管县（市）财政局：

根据财政部《关于下达 2026 年中央财政常态化帮扶资金预算的通知》（财农〔2026〕25 号）和《甘肃省财政常态化帮扶资金管理实施办法》（甘财振兴〔2026〕3 号），经研究，现下达你市（州）、县（市）2026 年中央财政常态化帮扶资金（资金规模详见附表）。项目名称：中央财政常态化帮扶资金（以下简称帮扶资金），收入请列一般公共预算收入科目“1100231”，支出请

列一般公共预算支出科目“21305”。项目名称：中央财政常态化帮扶资金；项目代码：10000015Z155110000004。现将有关事项通知如下：

一、合理安排使用资金。严格按照《甘肃省财政常态化帮扶资金管理实施办法》（甘财振兴〔2026〕3号）要求，聚焦守牢不发生规模性返贫致贫底线，紧扣省委省政府重点工作任务安排使用资金，严禁超范围使用帮扶资金，坚决杜绝负面清单事项；结合本地实际，统筹兼顾脱贫村和非贫困村实际情况，推动均衡发展。资金分配表中针对具体事项测算明确的资金额度，可在帮扶资金用途规定范围内，根据实际需要统筹安排使用。

二、突出资金支持重点。认真贯彻落实习近平总书记关于常态化帮扶有关重要指示精神和2026年中央、省级一号文件要求，强化重点政策和重点工作落实，持续加强产业帮扶、就业帮扶和欠发达地区开发式帮扶。优先支持联农带农富农产业发展，不断健全完善联农带农机制，支持发展壮大新型农村集体经济；持续加强就业帮扶，规范支持重点帮扶群体从事村内公益性岗位，提升产业项目带动就业促进增收的实效，统筹实施农村供水老旧管网改造提升三年行动。对过渡期通过中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支持的、截至过渡期结束仍未实施完毕的项目和政策，

可继续通过帮扶资金予以支持，确保项目顺利实施、政策有序转换和退出。

三、认真落实预算执行常态化监督有关要求。此次下达的帮扶资金列入转移支付预算执行常态化监督范围，各级财政部门要在预算管理一体化系统及时接收登录预算指标，并保持“追踪”标识不变，将资金分解落实到单位和具体项目时，对资金来源既包含中央财政帮扶资金又包含地方对应安排资金的，应在预算指标文件、预算管理一体化系统中按资金明细来源分别列示和登录预算指标。财政部门要依托预算管理一体化系统转移支付监控模块，加强日常监管，提高转移支付资金管理使用的规范性和有效性。

四、加强资金监督管理。各市县财政部门要督促农业农村等行业主管部门和资金使用部门加强帮扶资金项目管理，落实资金使用监管主体责任。要完善帮扶资金项目库，督促行业部门加强项目论证选择和尽快启动组织实施，确保“资金到位项目即可实施”。县级财政收到上级帮扶资金指标文件后5日内书面通知行业主管部门，行业主管部门应在30日内下达资金项目计划，财政部门根据项目计划在5日内分解下达资金指标，确保在规定时间内完成下达预算的完整流程。帮扶资金支持的项目原则上要从

帮扶资金项目库中选取，未纳入项目库的项目不得安排资金。涉及工程建设类项目，必须开展事前财政预算评审，评审通过后方可启动项目实施流程。要强化帮扶资金全过程绩效管理，对项目进展缓慢和资金支出率不达标的将按规定扣减当年资金，加强跟踪督促，全面提升资金使用效益。

附件：2026 年中央财政常态化帮扶资金分配表



抄送：财政部农业农村司，省农业农村厅、省发展改革委、省林草局、省民委，省农垦集团，财政部甘肃监管局，省纪委监委派驻省财政厅纪检监察组。

公开属性：依申请公开

甘肃省财政厅办公室

2026 年 5 月 15 日印发



甘肃省林业和草原局

甘林规函〔2026〕170号

甘肃省林业和草原局关于下达 2026 年中央财政常态化帮扶资金（欠发达国有林场巩固提升）任务计划的通知

天水市、武威市、张掖市、平凉市、庆阳市、定西市、陇南市林业和草原局，白龙江、小陇山林业保护中心：

根据《甘肃省财政厅关于下达 2026 年中央财政常态化帮扶资金预算的通知》（甘财振兴〔2026〕7号）的要求，《中央财政常态化帮扶资金管理办法》（财农〔2026〕10号）《甘肃省财政常态化帮扶资金管理实施办法》（甘财振兴〔2026〕14号）的相关规定，为扎实推进 2026 年欠发达国有林场巩固提升任务建设，现就有关事宜通知如下：

一、请尽快将任务计划下达到辖区县（区）、单位，并组织做好实施方案审定、项目落地实施等工作。

二、按照《关于印发甘肃省林业和草原局中央林草项目资金管理工作规则的通知》（甘林规发〔2025〕177号），以及《关于加快项目建设进度提高资金使用效益的意见》（甘林发〔2022〕67号）要求，市（州）、县（市、区）所属欠

发达国有林场巩固提升任务，在任务计划下达后 20 日内编制实施方案报市（州）林草主管部门审批，拟批复文件经省局审核后市（州）林草主管部门 5 个工作日内进行批复，并报省林草局林场种苗处备案。白龙江、小陇山保护中心在任务计划下达 20 日内编制实施方案，并在 5 个工作日内申请省林草局审批。

三、各项目主管单位要严格按照项目绩效加强监管，确保项目建设、资金支付进度。

- 附件：1. 2026 年第二批欠发达国有林场巩固提升项目资金任务计划表
2. 2026 年第二批欠发达国有林场巩固提升项目绩效目标表



2026年第二批欠发达国有林场巩固提升项目资金任务计划表

单位：万元

序号	国有林场名称	项目类别	建设内容	拟安排项目资金	备注
全省总计（32项）				3088	
市州合计（14项）				1218	
庆阳市小计				100	
1	华池分局大风川林场	产业	新庄台苗圃地新建苗圃生产道路507米；新建1.0米宽砂石路肩1014米；拆除原排水渠120米，新建U型排水渠906米；新建生物护坡400米；完成土壤改良20亩，定植云杉20亩8万株；新建防护工程2处。	100	试点林场
平凉市小计				260	
2	关山林业管理局红崖山林场	产业	建设七叶一枝花种植基地45亩，培育七叶一枝花12万株，大棚2座210平方米；配套蓄水池1座、给水管线200米、砂化道路50米、供电设施1套，架设防护设施4千米，设立公示牌1个。	90	
3	庄浪县石桥林场	产业	庄浪县石桥林场林区栽植淫羊藿150亩42万株，防护设施1600米，清理林地，后期管理，病虫害防治。	90	
4	泾川县官山林场	产业	泾川县官山林场养鸡1万只、养蜂220箱，种植茯苓80亩、板蓝根100亩，配套养殖所需蓄水池（含水泵）1座、防护设施1千米、砂化路300米、给水管线200米、场地硬化100平方米，供电1项。	80	
天水市小计				60	
5	清水县远门林场	产业	在白驼镇二寨村培育一年生（8×12cm）营养钵油松合格苗木50万株。	60	
陇南市小计				200	
6	成县赵坝林场	产业	在二郎乡庄子村新建苗圃基地50亩，培育连翘、板栗、漆树、栓皮栎、文冠果、淫羊藿等50万株，建设蓄水池20立方米，供水管网、喷灌设施1项，防护设施800米，采购苗木、工具等生产管护物资，新建遮阳大棚15座。	90	
7	陇南市岷江林业总场	产业	建设养殖林麝基地1处，其中：1.购置林麝8对（16头）；2.建设安全防护设施84米，配备防护网800平方米；3.新建饲料加工储存房、兽医室等功能用房以及标准化林麝圈舍，总建筑面积150平方米；4.配套建设供水300米、供电100米、道路100米、消毒池1处、粪便处理池1处。	110	
定西市小计				195	
8	岷县马坪林场	产业	在岷县寺沟镇、麻子川镇种植中药材30亩，其中：淫羊藿15亩、当归15亩、配套培育基地防护设施1千米。	45	
9	陇西县火焰山国有林场	产业	首阳镇南二十铺村新建育苗地1处20亩，其中：营养钵移栽种植侧柏10亩10万株，云杉10亩10万株；新建大田定植1处50亩，其中：定植培育侧柏40亩10.5万株，云杉10亩2.5万株；新建平床育苗1处10亩，其中：播种育苗文冠果10亩10万穴。配套附属防护设施1500米（包括立柱、铁蒺藜隔离防护设施等）。	75	
10	安定区车道岭林场	产业	在朱家店管护站林区养蜂50箱；在林场苗圃培育侧柏、文冠果良种10亩7万株，山毛桃、红柳优良乡土树种10亩18万株，新建温室2座1千平方米。	75	
张掖市小计				300	
11	甘州区黑河林场	产业	在甘州区黑河林场新建林禽养殖基地1处。其中购置禽苗9千只，其中鹅苗6千只，鸡苗3千只；搭建禽舍4处总面积1650平方米，安装隔离防护设施2550米，埋设输水管道910米，输电线路1070米，配套投食和饮水设备200套。	100	试点林场
12	民乐县六坝林场	产业	新建林药产业基地300亩，其中：甘草100亩、板蓝根100亩、黄芪苗100亩，配套相应的灌溉设施。	100	

序号	国有林场名称	项目类别	建设内容	拟安排项目资金	备注
13	山丹县十里堡林场	产业	提升改造经济林果园34亩,栽植梨、杏苗木3000株;林下种植白芍2.5亩6.6千株;引进栽植抗寒月季5亩1.3万株;新建晒场500平方米、铺设φ630mm输水管道1.1公里。	100	
武威市小计				103	
14	武威市石羊河林业总场	产业	建设砂砾石作业便道267米、铺砖作业便道328米,压设节水管道249米,维修葡萄院围墙327米;改造苗圃管理用房14间370平方米;改造提升葡萄园3.7亩;改建葡萄园9亩,栽植妮那皇后、克瑞森早熟无核、黄金密等品种葡萄646株,栽植桃、李、杏等118株。	103	试点林场
省属国有林场合计(18项)				1870	
白龙江小计(9项)				920	
15	迭部生态建设管护中心	产业	购买猴头菇菌棒3万棒;购买香菇菌棒2万棒;大棚改造4座(1600平方米);喷淋系统4套;菌棒支架15棚。	120	试点林场
16	迭部生态建设管护中心	产业	腊子口林场拟种植林下仿野生淫羊藿36亩,15万株;维修简易生产资料仓储库房182平方米;新建简易桥一座,跨度8米,宽2米;安装移动式抽水机4台及配套管道500米;新建铁丝防护设施1.2千米,高1.5米。	95	试点林场
17	阿夏省级自然保护区管护中心	产业	达拉保护站恢复水毁苗圃地14亩(包括购买腐殖土1600立方米、有机肥3500公斤);维修浆砌石堡坎200立方米。	75	
18	插岗梁省级自然保护区管护中心	产业	沙滩保护站苗圃地新建金属防护设施1500米(高1.8米),排水渠800米,浆砌石挡墙700立方米,平整土方1500立方米。	75	试点林场
19	博峪河省级自然保护区管护中心	产业	博峪河管护中心中路河保护站对养鸡场提升改造,购置全自动福利笼养殖设备1套,90日龄鸡苗1万只。	100	试点林场
20	兰州北山生态建设管护中心	产业	在北山生态建设管护中心杏花产业基地:1.安装太阳能光伏发电设施1套,包括安装光伏板及储能电池等相关组件;2.配置及安装1套400kVA供电系统,包含受电部分(户外高压断路器1台)、变压部分(400kVA油浸/干式变压器1台)、配电及补偿部分(高压电容补偿柜1台、低压配电柜2台、配电箱1个)及站内连接所需的配套电缆;3.扩建散养鸡场1处5000平方米。	160	
21	兰州北山生态建设管护中心	产业	在兰州北山生态建设管护中心乔家坪产业基地:1.土壤改良14亩;2.维修加固蓄水池13座;3.维修加固大棚13座;4.安装果树遮鸟网1.12万平方米;5.种植樱桃14亩。	95	
22	洮河生态建设管护中心	产业	维修人工湖浆砌石堤坝110立方米、浆砌石挡墙105立方米;人工湖渠清淤10900立方米;改建混凝土路肩35立方米;改造卫生间1座(含洁具给排水及化粪池)、混凝土凉亭2座(含基础);维修桥墩40立方米;维修堤坝闸门浆砌石38立方米;更换堤坝闸门1套。	70	
23	南华生态建设管护中心	产业	新建防护设施850米。扦插怪柳6亩15万株;定植白榆14亩1.45万株;定植山杏6亩4千株;定植绚丽海棠5亩830株;定植金叶榆球2.5亩450株;定植金叶榆3亩500株;定植紫叶矮樱4.5亩480株;定植文冠果3亩500株;定植丁香3亩320株;定植塔柏3亩400株,定植山楂1.5亩333株;定植鸡心果1.5亩333株,定植榆叶梅3亩500株;定植紫叶稠李3亩500株;定植暴马丁香2亩333株。	130	试点林场
小陇山小计(9项)				950	
24	榆树林场	产业	在刻坝森林经营管理所57林班种植猪苓140亩,配套铁丝防护设施1080米。	100	试点林场
25	滩歌林场	产业	在卧牛山森林公园修建森林康养步道1千米,布设生态文化室1处60平方米,建设森林体验基地1处1665平方米。	140	
26	山门林场	产业	在百家森林经营管理所12林班种植茯苓50亩、中药材独活10亩,育通森林经营管理所108林班培育大棚木耳3亩。	92	
27	太碌林场	产业	在桦树坝森林经营管理所44林班栽植榛子苗木80亩。包括:1.割灌割藤、林地清理、土地平整80亩。2.整地刨穴、人工栽植榛子苗木1.2万株。3.平茬、抹芽1.2万株。4.田间管理(除草、浇灌、施肥、病虫害防治)。5.配套防护设施2.4千米。	98	

序号	国有林场名称	项目类别	建设内容	拟安排项目资金	备注
28	立远林场	产业	在金龙山景区管理所61林班、散岔森林经营管理所54林班苗圃地提升改建27亩；覆熟土1200立方米；浆砌石护坡666立方米；修建排水渠300米；钢丝防护设施1200米；水泥铁栏防护设施180米；铺设步道500米；喷灌设施2套。	110	
29	左家林场	产业	在太阳森林经营管理所49林班林下种植猪苓80亩，配套防护设施2000米。	100	
30	观音林场	产业	在曲溪森林公园康养基地修建人行步道1500米，浆砌步道护坡580立方米，建设拱涵15米，沿途设置垃圾桶8个；建设休憩区两处，每处面积10平方米，各配备防雨木棚1座、石质桌椅1套、垃圾桶1个。	120	
31	张家林场	产业	在兴隆森林经营管理所24林班种植猪苓80亩，配套防护设施1500米。	100	
32	云坪林场	产业	在广金森林经营管理所27林班种植猪苓100亩，配套金属防护设施1000米。	90	

2026年欠发达国有林场巩固提升任务项目绩效目标表

项目名称		2026年欠发达国有林场巩固提升任务插岗梁省级自然保护区管护中心苗圃基础设施建设项目		项目负责人及联系电话	张鹏13389391616
项目主管单位		甘肃省白龙江林业保护中心		实施单位	插岗梁省级自然保护区管护中心
项目监管单位		甘肃省林业和草原局		项目开始日期	2026年6月
资金情况		年度资金总额：		75.00万元	
		其中：财政拨款		75.00万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	沙滩保护站苗圃地新建金属防护设施1500米（高1.8米），排水渠800米，浆砌石挡墙700立方米，平整土方1500立方米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	高1.8米金属防护设施		≥1500米
			排水渠		≥800米
			浆砌石挡墙		≥700立方米
			平整土方		≥1500立方米
		质量指标	质量验收合格率		100%
		时效指标	项目完成时限		2026年12月前
		成本指标	项目建设总费用		75万元
	效益指标	经济指标	国有林场苗木生产水平		提升
		社会效益指标	国有林场抵抗自然灾害能力		提升
		生态效益指标	国有林场生态环境		改善
		可持续影响指标	林场可持续发展能力		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工及周边群众满意度		≥90%

甘肃省白龙江林业保护中心文件

白林规函〔2026〕13号

白龙江林业保护中心转下达 2026年中央财政常态化帮扶资金 (欠发达国有林场巩固提升)任务计划的通知

各管护中心:

根据《甘肃省林业和草原局关于下达 2026 年中央财政常态化帮扶资金(欠发达国有林场巩固提升)任务计划的通知》(甘林规函〔2026〕170号)的要求,为扎实推进 2026 年欠发达国有林场巩固提升任务建设,现将 2026 年中央财政常态化帮扶资金任务计划转下达你们(详见附件),请结合以下要求认真落实。

各单位要根据《中央财政常态化帮扶资金管理办法》(财农〔2026〕10号)《甘肃省财政常态化帮扶资金管理实施办法》(甘财振兴〔2026〕14号)的相关规定,按照下达的项目建设内容,

在任务计划下达 10 日内编制实施方案（作业设计）一式六份（不得随意变更建设地点和建设内容），报保护中心审核后申请省林草局批复。各项目实施单位在实施方案（作业设计）批复后，要严格按照批复内容，及时组织项目实施，确保按期完成任务计划。

各单位务必高度重视，强化绩效管理，细化绩效目标，做好绩效目标备案和绩效监控工作，确保绩效任务如期实现。同时，要严格按照资金管理办法要求，切实加强资金和项目管理，专款专用，严禁挤占、截留、挪用专项资金，充分发挥资金使用效益。

特此通知

附件：1.2026 年第二批欠发达国有林场巩固提升项目资金任务计划表

2.2026 年第二批欠发达国有林场巩固提升项目绩效目标表



抄送：中心各位领导，造林处、审计处、规财处。

甘肃省白龙江林业保护中心办公室

2026 年 5 月 27 日印发

2026年第二批欠发达国有林场巩固提升项目资金任务计划表

单位：万元

序号	国有林场名称	项目类别	建设内容	拟安排项目资金	备注
白龙江小计（9项）				920	
1	迭部生态建设管护中心	产业	购买猴头菇菌棒3万棒；购买香菇菌棒2万棒；大棚改造4座（1600平方米）；喷淋系统4套；菌棒支架15棚。	120	试点林场
2	迭部生态建设管护中心	产业	腊子口林场拟种植林下仿野生淫羊藿36亩，15万株；维修简易生产资料仓储库房182平方米；新建简易桥一座，跨度8米，宽2米；安装移动式抽水机4台及配套管道500米；新建铁丝防护设施1.2万米，高1.5米。	95	试点林场
3	阿夏省级自然保护区管护中心	产业	达拉保护站恢复水毁苗圃地14亩（包括购买腐殖土1600立方米、有机肥3500公斤）；维修浆砌石堡坎200立方米。	75	
4	插岗梁省级自然保护区管护中心	产业	沙滩保护站苗圃地新建金属防护设施1500米（高1.8米），排水渠800米，浆砌石挡墙700立方米，平整土方1500立方米。	75	试点林场
5	博峪河省级自然保护区管护中心	产业	博峪河管护中心中路河保护站对养鸡场提升改造，购置全自动福利笼养殖设备1套，90日龄鸡苗1万只。	100	试点林场
6	兰州北山生态建设管护中心	产业	在北山生态建设管护中心杏花产业基地：1. 安装太阳能光伏发电设施1套，包括安装光伏板及储能电池等相关组件；2. 配置及安装1套400kVA供电系统，包含受电部分（户外高压断路器1台）、变压部分（400kVA油浸/干式变压器1台）、配电及补偿部分（高压电容补偿柜1台、低压配电柜2台、配电箱1个）及站内连接所需的配套电缆；3. 扩建散养鸡场1处5000平方米。	160	
7	兰州北山生态建设管护中心	产业	在兰州北山生态建设管护中心乔家坪产业基地：1. 土壤改良14亩；2. 维修加固蓄水池13座；3. 维修加固大棚13座；4. 安装果树遮鸟网1.12万平方米；5. 种植樱桃14亩。	95	
8	洮河生态建设管护中心	产业	维修人工湖浆砌石堤坝110立方米、浆砌石挡墙105立方米；人工湖渠清淤10900立方米；改建混凝土路肩35立方米；改造卫生间1座（含洁具给排水及化粪池）、混凝土凉亭2座（含基础）；维修桥墩40立方米；维修堤坝闸门浆砌石38立方米；更换堤坝闸门1套。	70	
9	南华生态建设管护中心	产业	新建防护设施850米。扦插怪柳6亩15万株；定植白榆14亩1.45万株；定植山杏6亩4千株；定植绚丽海棠5亩830株；定植金叶榆球2.5亩450株；定植金叶榆3亩500株；定植紫叶矮樱4.5亩480株；定植文冠果3亩500株；定植丁香3亩320株；定植塔柏3亩400株，定植山植1.5亩333株；定植鸡心果1.5亩333株，定植榆叶梅3亩500株；定植紫叶稠李3亩500株；定植暴马丁香2亩333株。	130	试点林场

2026年欠发达国有林场巩固提升任务项目绩效目标表

项目名称		2026年欠发达国有林场巩固提升任务插岗梁省级自然保护区管护中心苗圃基础设施建设项目		项目负责人及联系电话	张鹏13389391616
项目主管单位		甘肃省白龙江林业保护中心		实施单位	插岗梁省级自然保护区管护中心
项目监管单位		甘肃省林业和草原局		项目开始日期	2026年6月
资金情况		年度资金总额：		75.00万元	
		其中：财政拨款		75.00万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	沙滩保护站苗圃地新建金属防护设施1500米（高1.8米），排水渠800米，浆砌石挡墙700立方米，平整土方1500立方米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	高1.8米金属防护设施		≥1500米
			排水渠		≥800米
			浆砌石挡墙		≥700立方米
			平整土方		≥1500立方米
		质量指标	质量验收合格率		100%
		时效指标	项目完成时限		2026年12月前
		成本指标	项目建设总费用		75万元
	效益指标	经济指标	国有林场苗木生产水平		提升
		社会效益指标	国有林场抵抗自然灾害能力		提升
		生态效益指标	国有林场生态环境		改善
		可持续影响指标	林场可持续发展能力		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工及周边群众满意度		≥90%

工程量统计表				
	内容	单位	数量	备注
①	排水渠	m	692	其中1#排水渠333m；2#排水渠137m，3#排水渠222m。
②	铺10mm夹布橡胶板	m ²	297.60	购置成品
③	∅1000钢筋混凝土检查井	个	3	做法详见国标图集20S515－29,井盖（铸铁井盖）做法见2112S3－73

会 签 Joint Check up			
总图		建筑	
规划		结构	
农林		电气	
公路		给排水	
水利		暖通	

备 注			
* 本图纸的版权,属中苑工程设计有限公司所有,不得用于本工程以外范围.			
* 本图纸需手续齐全方可用于施工.			

平面示意 Plane Diagram			

单位出图章 Company Seal			




中苑工程设计有限公司
ZhongYuan Engineering Design Co., Ltd

签 署 Signature		
项目负责人 Item Prin	涂梦如	涂梦如
专业负责人 Chief	涂梦如	涂梦如
审 定 Approved		
审核 Examined	王秀红	王秀红
校对 Checked	陈真荣	陈真荣
设计 Designed	赵倩	赵倩

工程名称 Project			
2026年欠发达国有林场巩固提升任务插岗梁省级自然保护区管护中心苗圃基础设施建设项目			

子项名称 Sub Item			

图纸名称 Title			
工程量统计表			
工程号 Pjt .No.		图 号 Dwg. No.	01
专 业 Dept.	建筑	阶 段 Stage	实施方案
比 例 Scale	1:100	日 期 Date	2026年5月

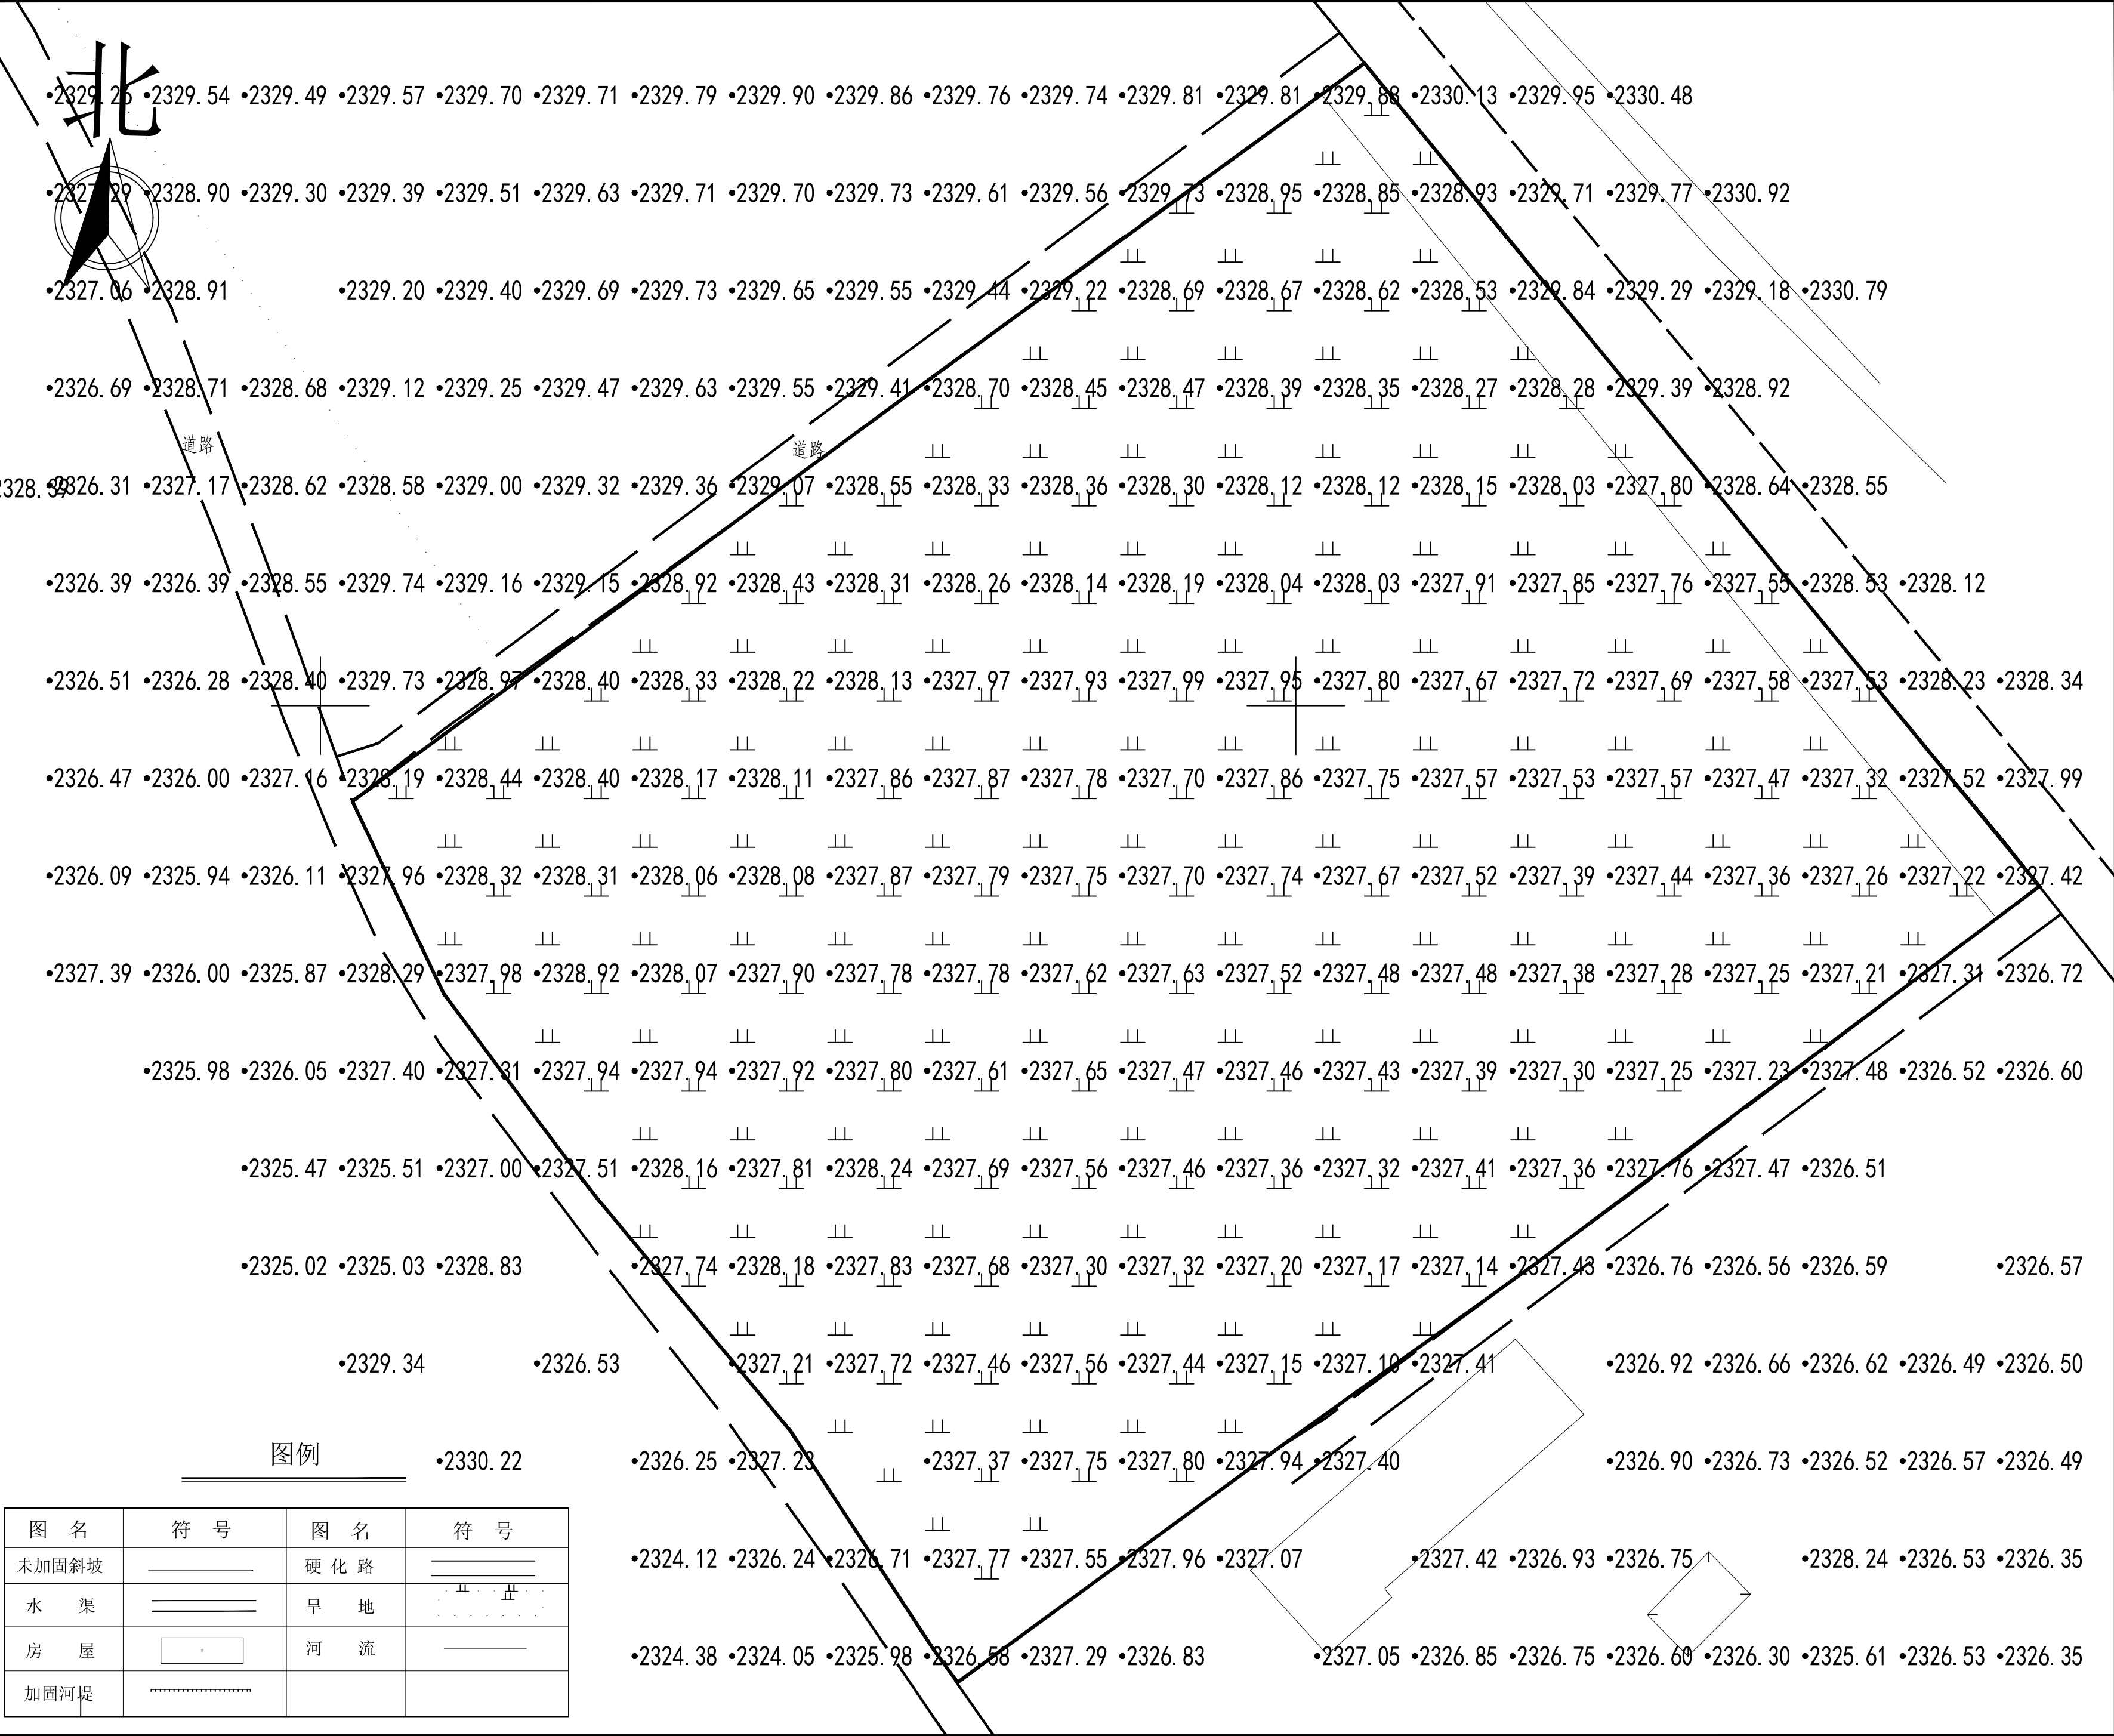

■ 会 签

Joint Check up

总图		建筑	
规划		结构	
农林		电气	
公路		给排水	
水利		暖通	

■ 备 注

* 本图纸的版权, 属中苑工程设计有限公司所有,
不得用于本工程以外范围.

* 本图纸需手续齐全方可用于施工.

■ 平面示意

Plane Diagram

■ 单位出图章

Company Seal



中苑工程设计有限公司
ZhongYuan Engineering Design Co., Ltd

■ 签 署

Signature

项目负责人 Item Prin	涂梦如	
专业负责人 Chief	涂梦如	
审 定 Approved	涂梦如	
审核 Examined	王秀红	
校对 Checked	陈真荣	
设计 Designed	赵倩	

■ 工程名称

Project

2026年欠发达国有林场巩固提升任务插岗梁省级自然保护区管护中心
苗圃基础设施建设项目

■ 子项名称


Sub Item

■ 图纸名称

Title

原始地形图

工程号 Pjt .No.		图 号 Dwg. No.	02
专 业 Dept.	建筑	阶 段 Stage	实施方案
比 例 Scale	1:100	日 期 Date	2026年5月

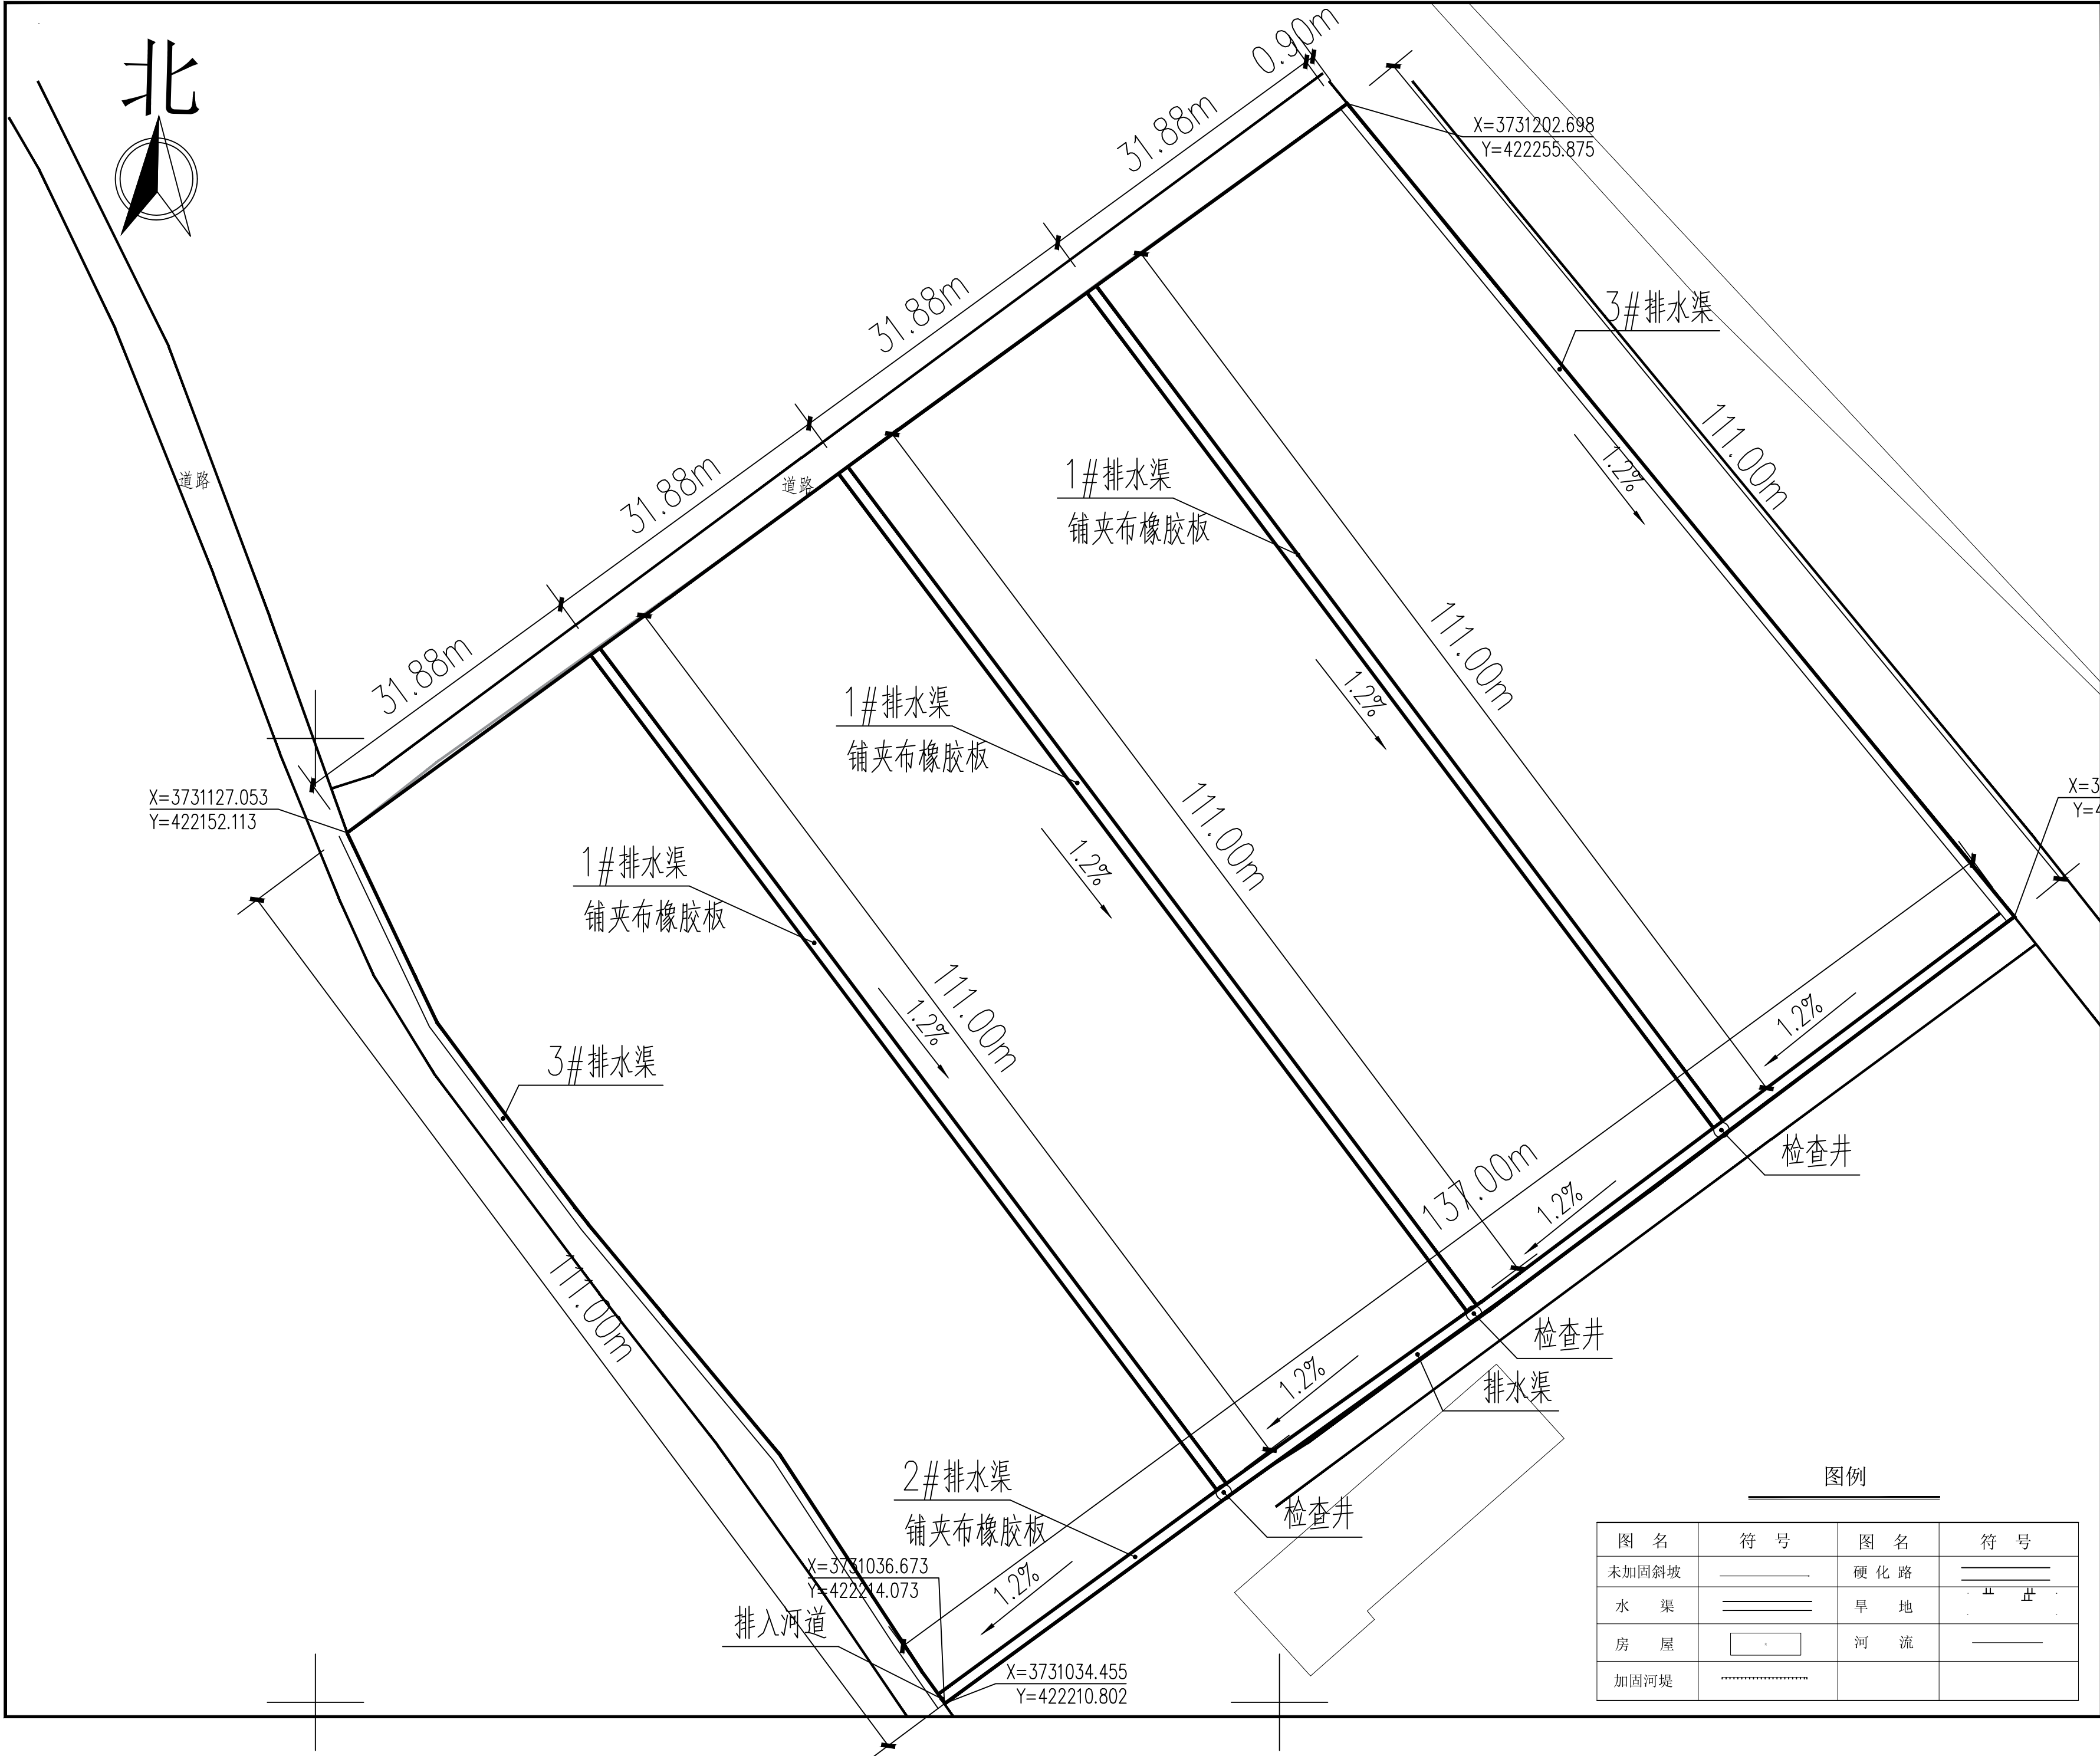

会 签 Joint Check up

总图		建筑	
规划		结构	
农林		电气	
公路		给排水	
水利		暖通	

备 注

* 本图纸的版权, 属中苑工程设计有限公司所有, 不得用于本工程以外范围.

* 本图纸需手续齐全方可用于施工.




平面示意 Plane Diagram

单位出图章 Company Seal



中苑工程设计有限公司
ZhongYuan Engineering Design Co., Ltd

签 署 Signature

项目负责人 Item Prin	涂梦如	
专业负责人 Chief	涂梦如	
审 定 Approved	涂梦如	
审核 Examined	王秀红	
校对 Checked	陈真荣	
设计 Designed	赵倩	

工程名称 Project





2026年欠发达国有林场巩固提升任务插岗梁省级自然保护区管护中心苗圃基础设施建设项目

子项名称 Sub Item


图纸名称 Title

总平面布置图

工程号 Pjt . No.		图 号 Dwg. No.	03
专 业 Dept.	建筑	阶 段 Stage	实施方案
比 例 Scale	1:100	日 期 Date	2026年5月

图 例			
图 名	符 号	图 名	符 号
未加固斜坡		硬 化 路	
水 渠		旱 地	
房 屋		河 流	
加固河堤			

工程号 Pjt. No.		图 号 Dwg. No.	04
专 业 Dept.	建筑	阶 段 Stage	实施方案
比 例 Scale	1:100	日 期 Date	2026年5月

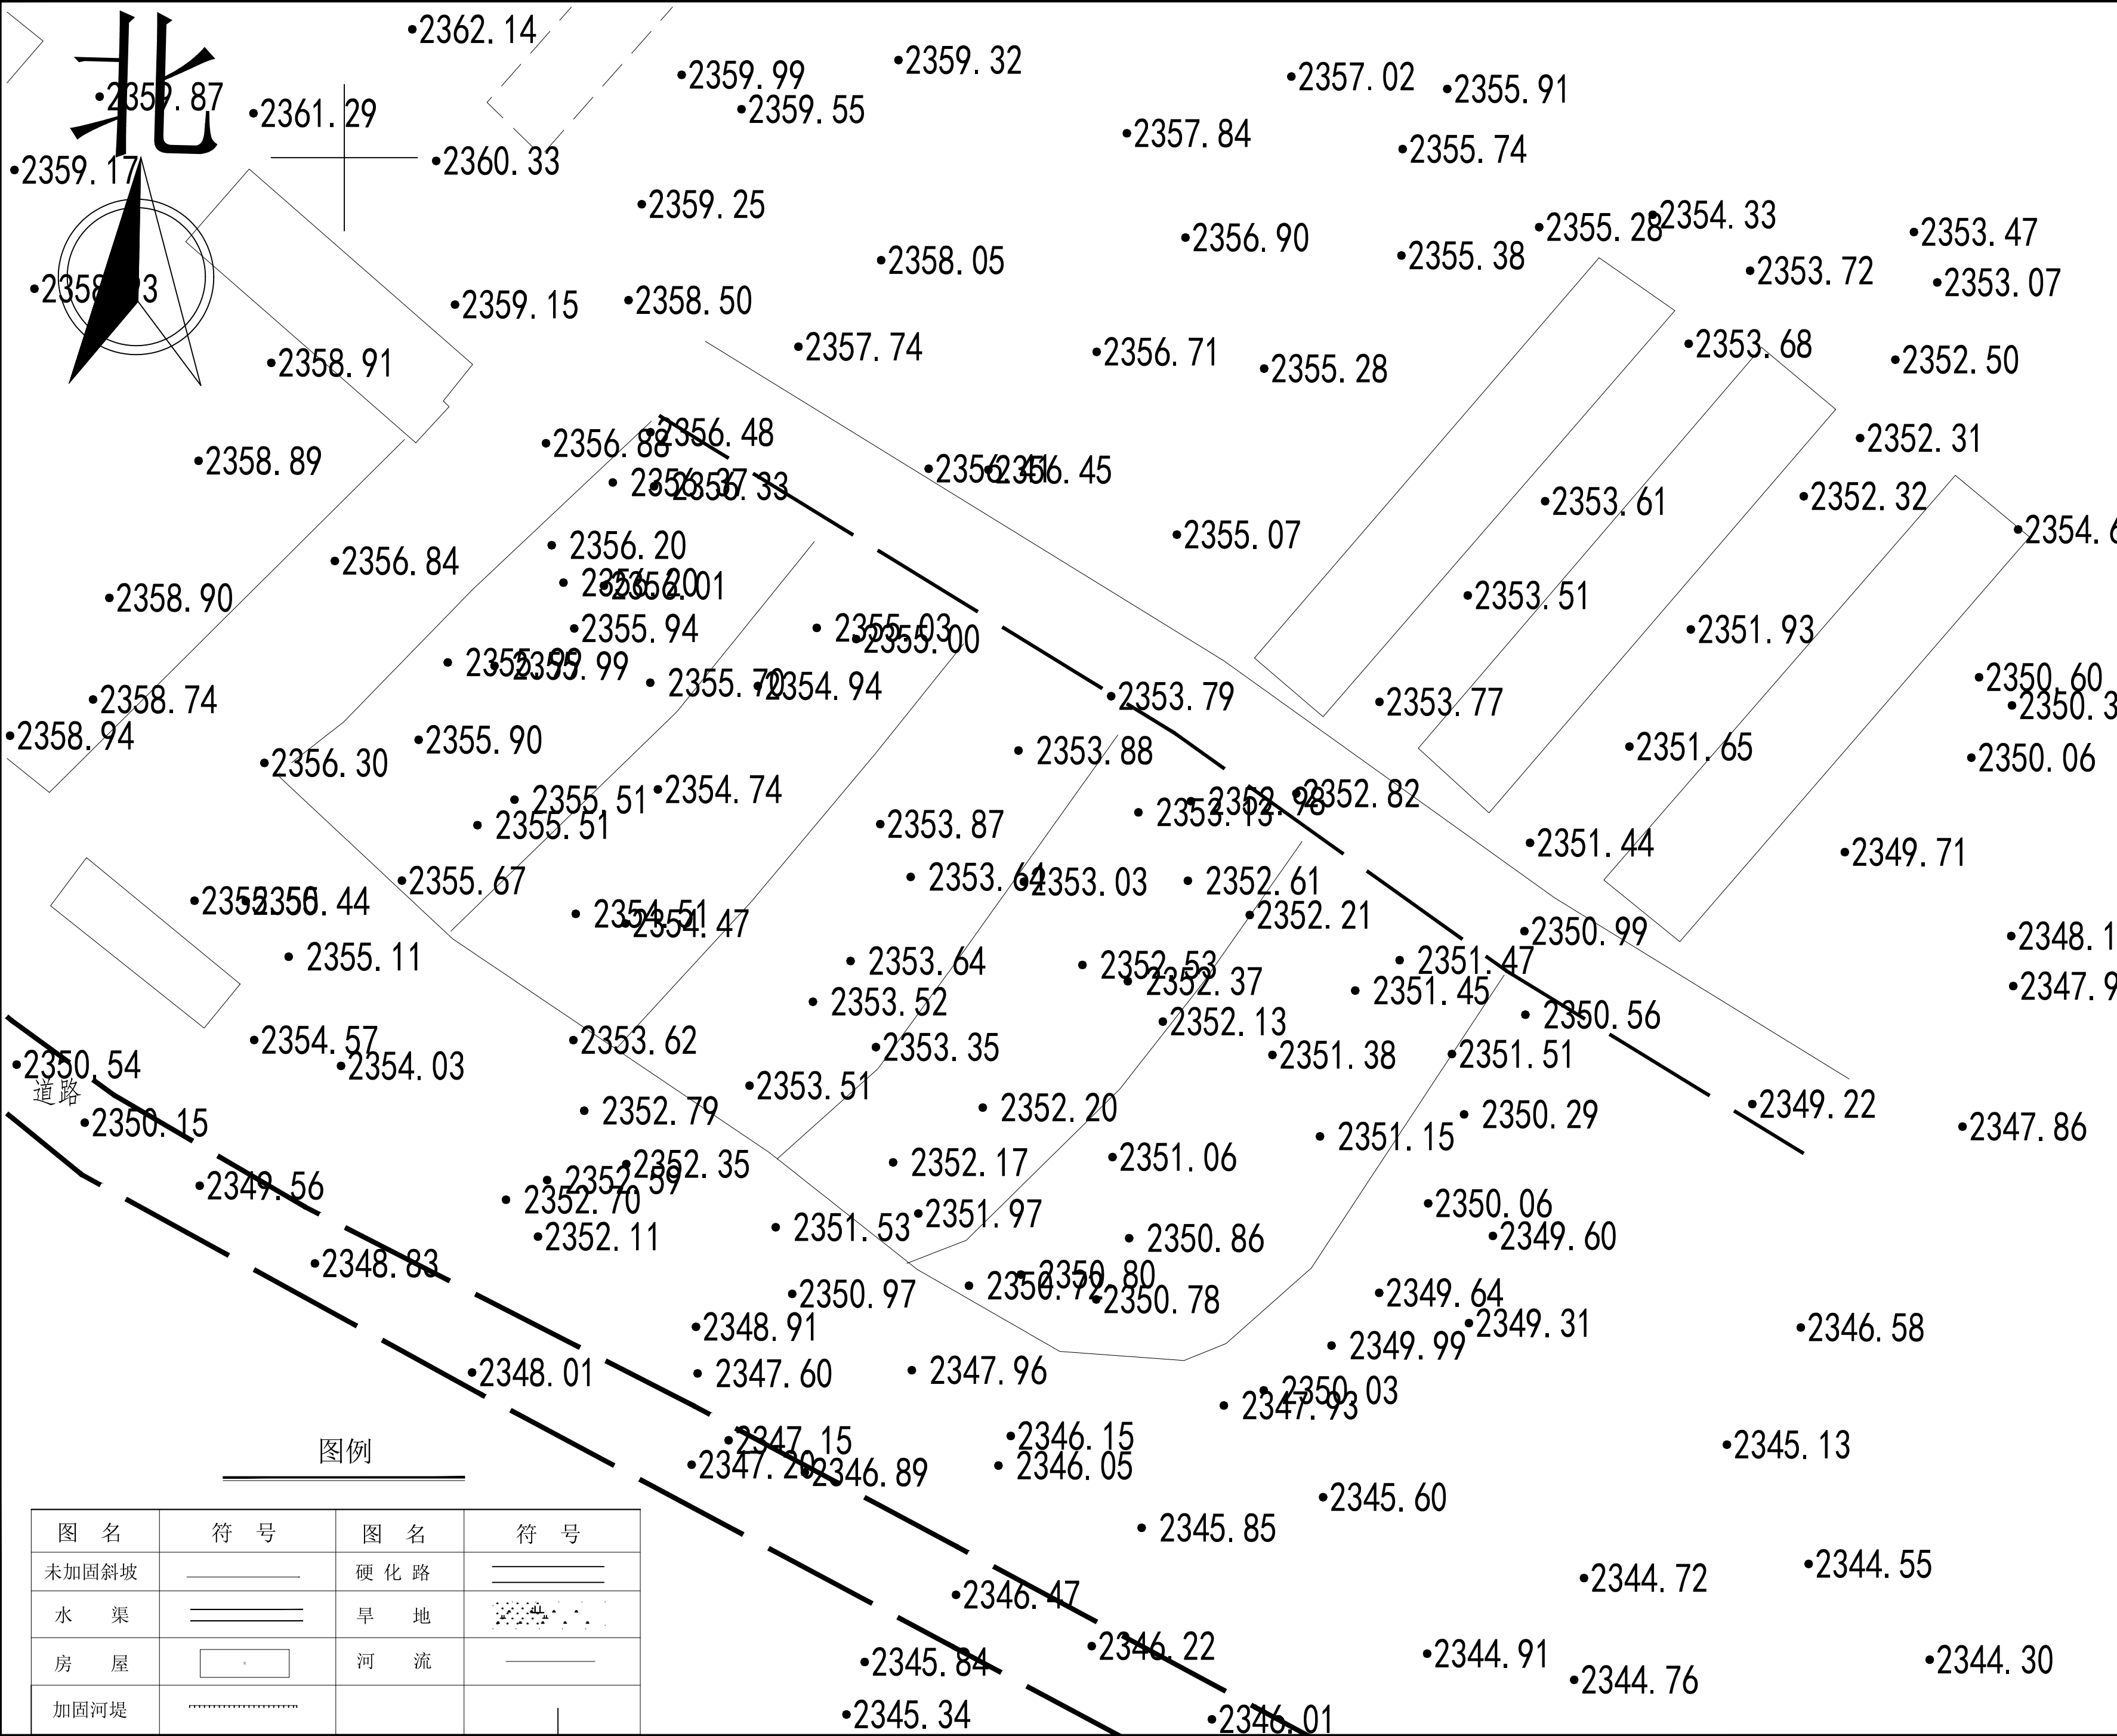

■ 会 签 Joint Check up

总图		建筑	
规划		结构	
农林		电气	
公路		给排水	
水利		暖通	

■ 备 注

* 本图纸的版权, 属中苑工程设计有限公司所有,
不得用于本工程以外范围.
* 本图纸需手续齐全方可用于施工.





■ 平面示意 Plane Diagram

■ 单位出图章 Company Seal



中苑工程设计有限公司
ZhongYuan Engineering Design Co., Ltd

■ 签 署 Signature

项目负责人 Item Prin	涂梦如	
专业负责人 Chief	涂梦如	
审 定 Approved	涂梦如	
审核 Examined	王秀红	
校对 Checked	陈真荣	
设计 Designed	赵倩	

■ 工程名称 Project


2026年欠发达国有林场巩固提升任务插岗梁省级自然保护区管护中心
苗圃基础设施建设项目

■ 子项名称 Sub Item

■ 图纸名称 Title

原始地形图

工程号 Pjt .No.		图 号 Dwg. No.	06
专 业 Dept.	建筑	阶 段 Stage	实施方案
比 例 Scale	1:100	日 期 Date	2026年5月



会 签 Joint Check up			
总图		建筑	
规划		结构	
农林		电气	
公路		给排水	
水利		暖通	




备 注			
* 本图纸的版权, 属中苑工程设计有限公司所有, 不得用于本工程以外范围.			
* 本图纸需手续齐全方可用于施工.			

平面示意 Plane Diagram			

单位出图章 Company Seal			



中苑工程设计有限公司
ZhongYuan Engineering Design Co., Ltd


签 署 Signature			
项目负责人 Item Prin	涂梦如		
专业负责人 Chief	涂梦如		
审 定 Approved			
审核 Examined	王秀红		
校对 Checked	陈真荣		
设计 Designed	赵倩		

工程名称 Project
2026年欠发达国有林场巩固提升任务插岗梁省级自然保护区管护中心苗圃基础设施建设项目

子项名称 Sub Item



图纸名称 Title
总平面图

工程号 Pjt .No.		图 号 Dwg. No.	07
专 业 Dept.	建筑	阶 段 Stage	实施方案
比 例 Scale	1:100	日 期 Date	2026年5月

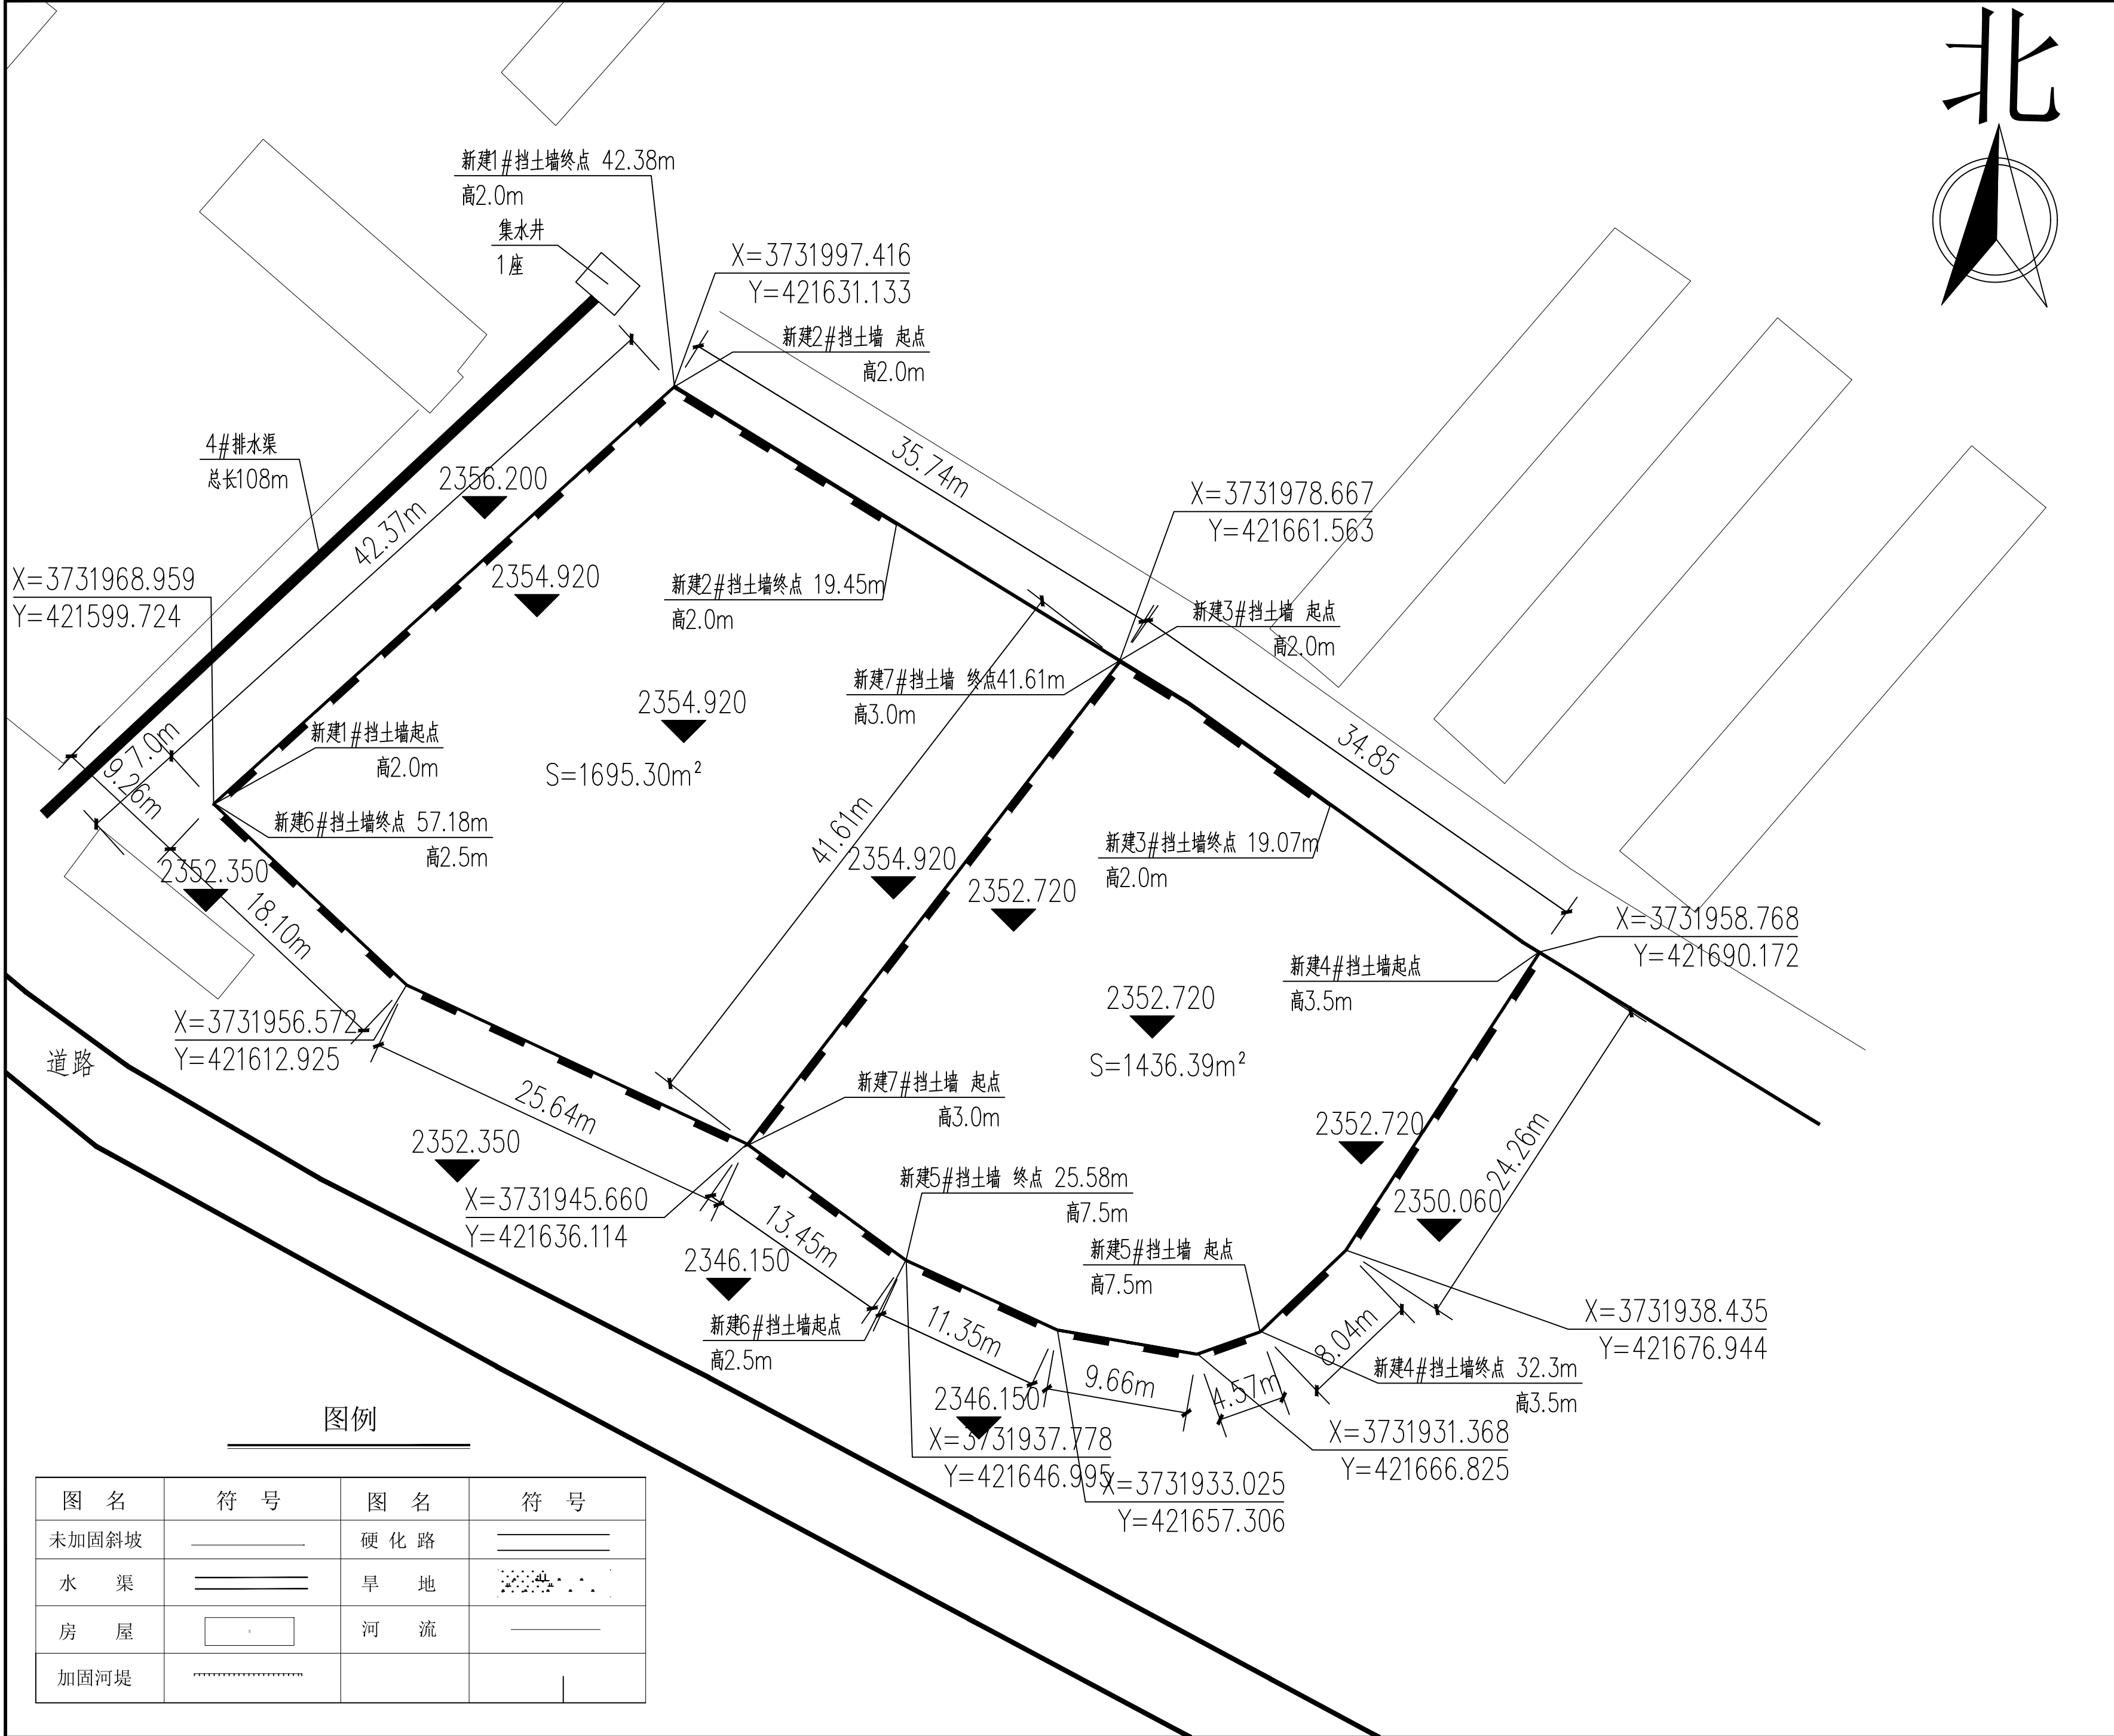


图例

图 名	符 号	图 名	符 号
未加固斜坡	———	硬 化 路	=====
水 渠	=====	旱 地	
房 屋	□	河 流	———
加固河堤			

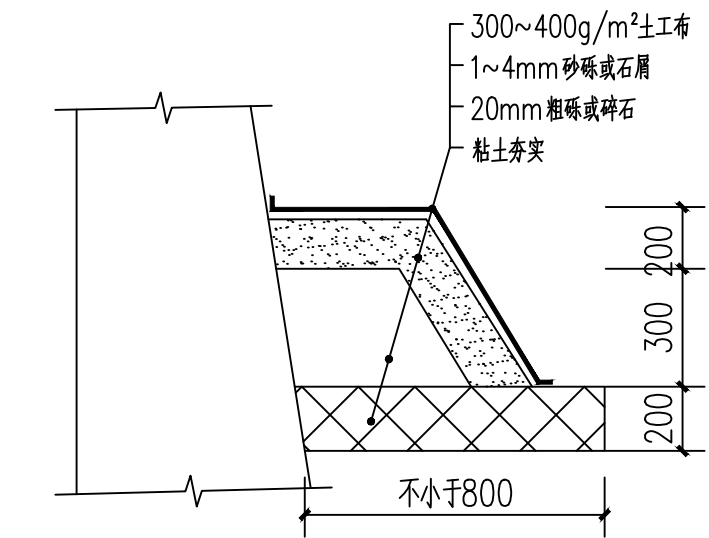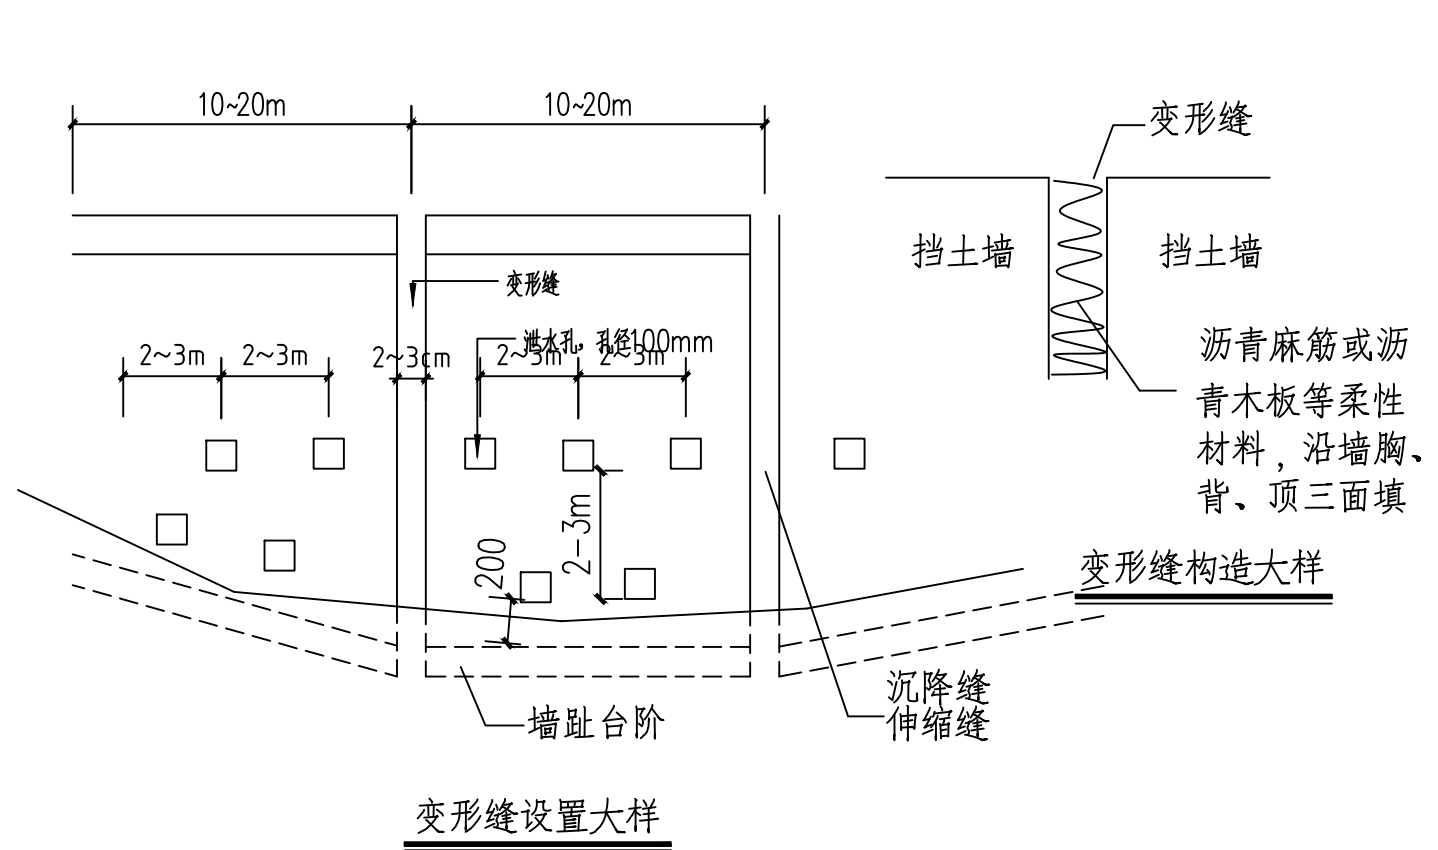

挡土墙后反滤包大样

- 挡土墙说明:
- 基础持力层承载力特征值180KPa。
 - 毛石砌筑时, 石材强度等级MU30, 单片厚度不小于15cm, 水泥砂浆强度等级M7.5。
 - 泄水孔一般为直径不小于100mm的圆孔或100-200mm的方孔。孔眼间距为2-3m, 上下左右交错放置, 泄水孔前宜用粗砂掺粗石骨料渗水。墙顶地面宜铺防水层。厚度h=200mm。
 - 施工时必须确保重力式墙趾顶土厚度≥200mm, 并要求夯填密实。
 - 本图标高相当于绝对高程。
 - 挡土墙平面布置详建施总平面图。
 - 未尽事宜参照17J008挡土墙重力式、衡重式、悬臂式挡土墙标准图集执行。

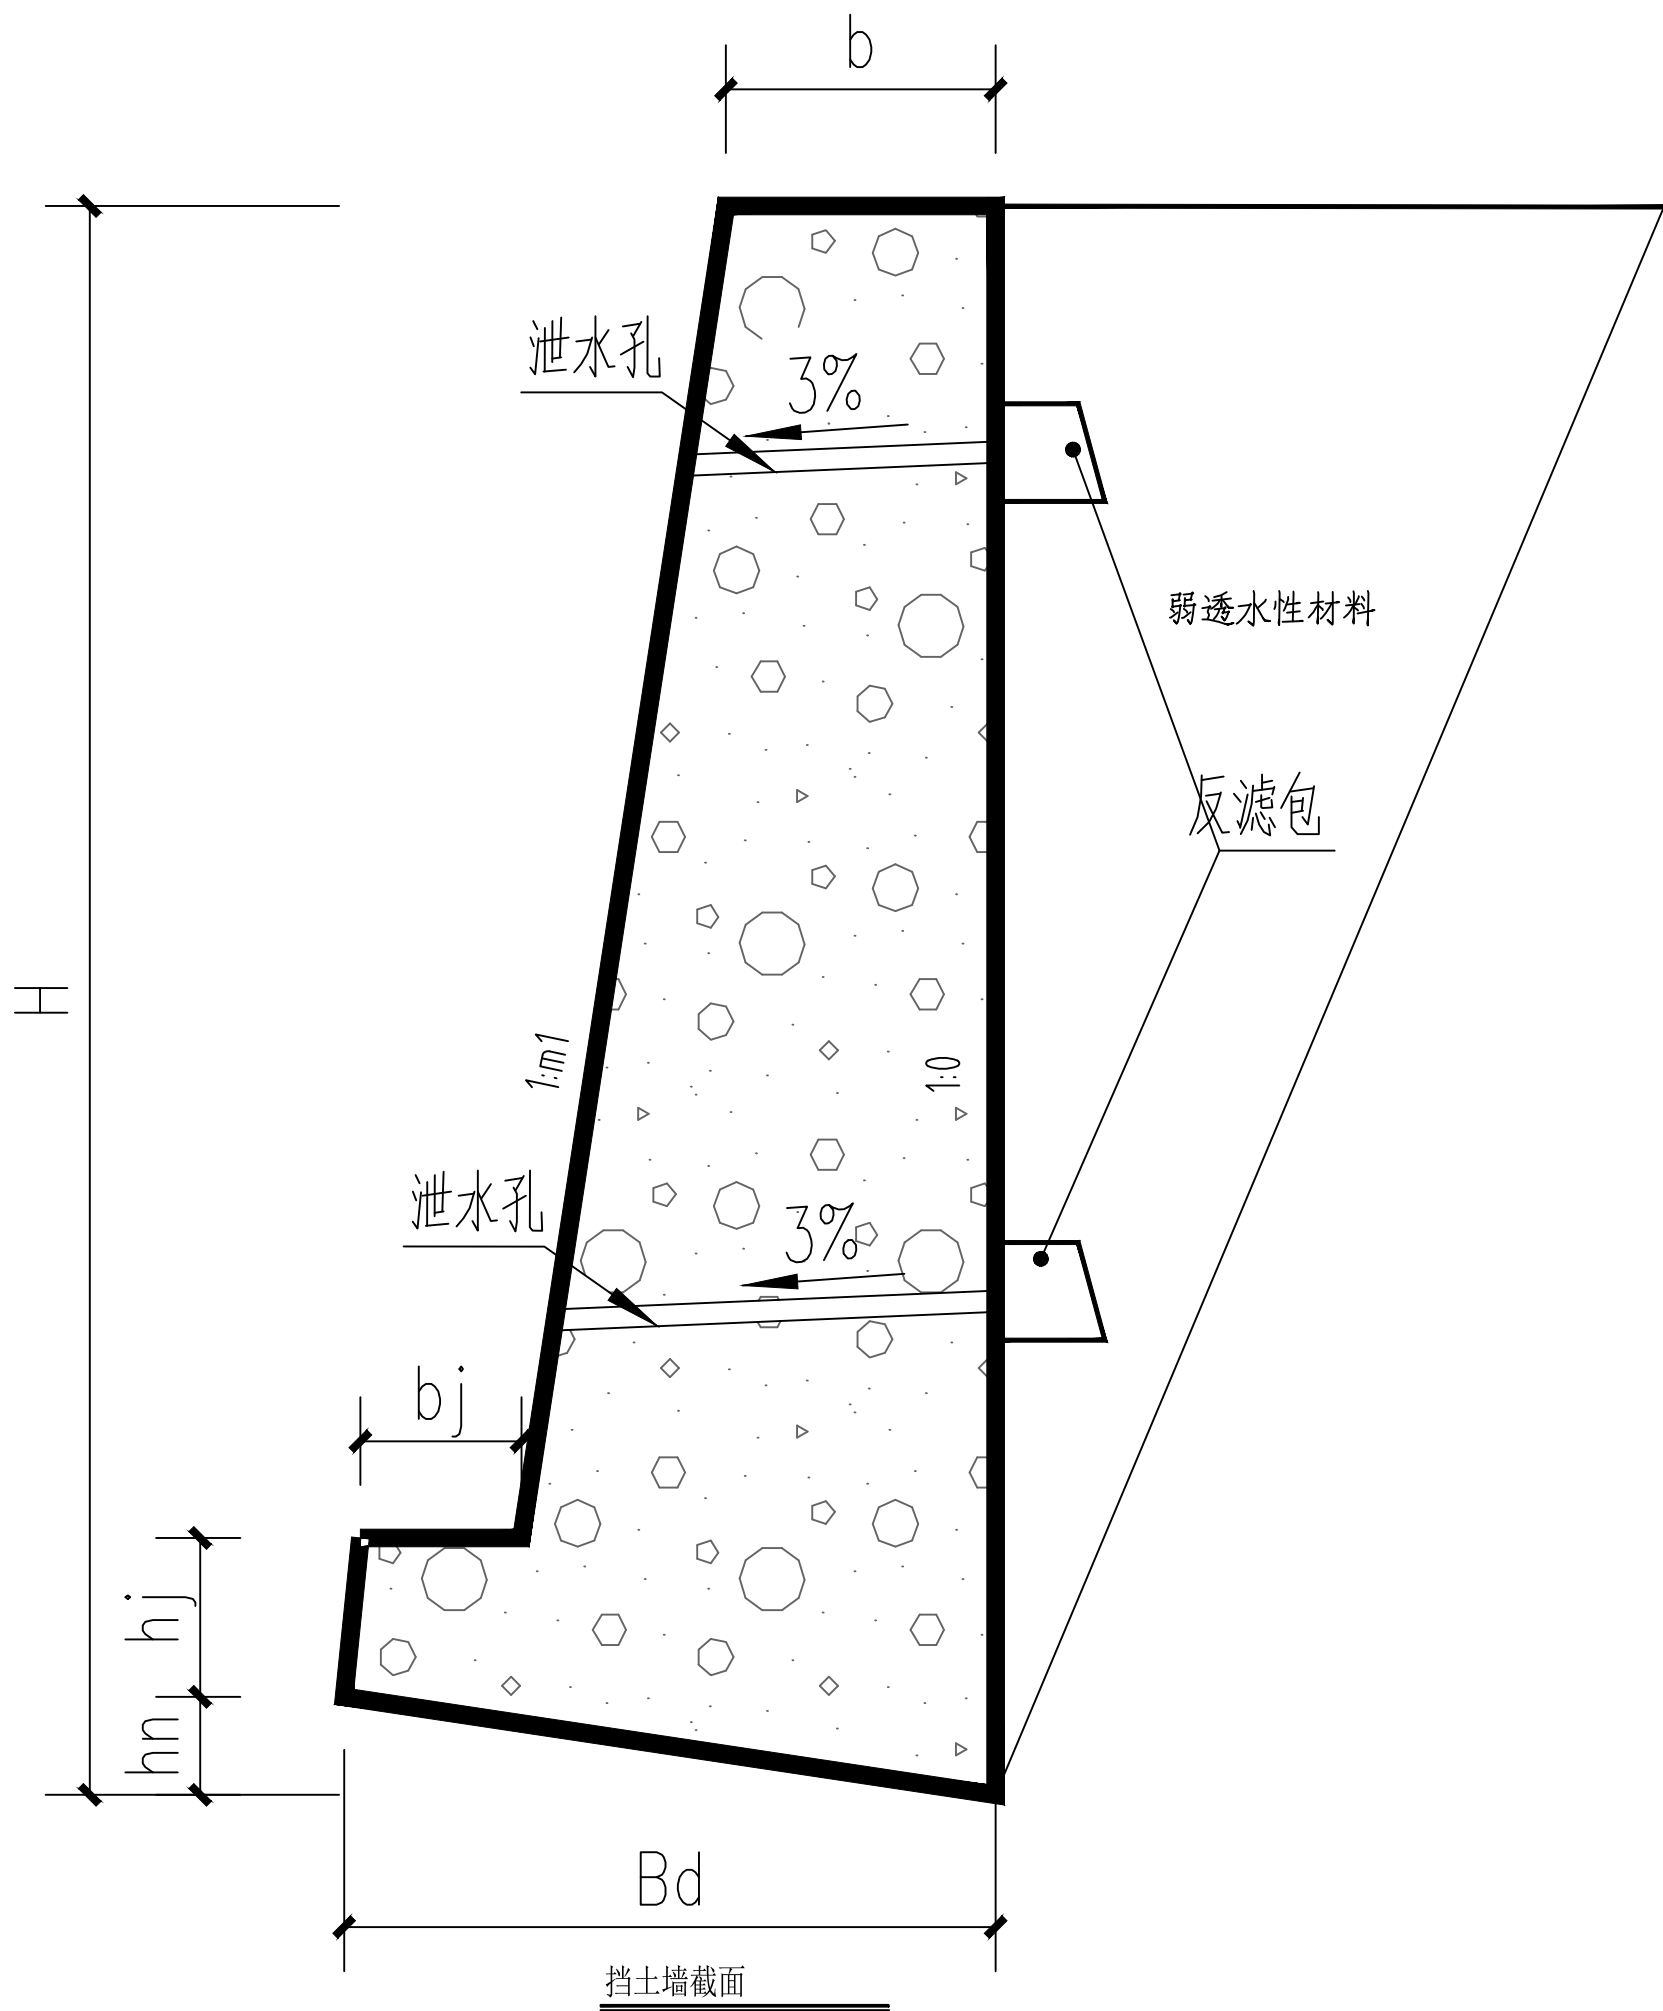

挡 土 墙 选 用 表												
编号	H (mm)	h _j (mm)	h _n (mm)	b (mm)	B _d (mm)	b _j (mm)	1: m1	1: n	θ (度)	长度 (m)	每米方量/总方量(m3)	
1#挡土墙 (2.0m高)	2000	400	187	402	935	180	1: 0.25	1:0.20	37.90	42.37	1.28/54.234	
2#挡土墙 (2.0m高)	2000	400	187	402	935	180	1: 0.25	1:0.20	37.90	19.45	1.28/24.896	
3#挡土墙 (2.0m高)	2000	400	187	402	935	180	1: 0.25	1:0.20	37.90	19.07	1.28/24.41	
4#挡土墙 (3.5m高)	3500	500	294	579	1470	215	1: 0.25	1:0.20	35.1	32.3	3.43/110.789	
5#挡土墙 (7.5m高)	7500	700	490	568	2450	305	1: 0.25	1:0.20	27.80	25.58	10.87/278.055	
6#挡土墙 (2.5m高)	2500	400	187	402	935	180	1: 0.25	1:0.20	37.90	57.18	1.79/102.352	
7#挡土墙 (3.0m高)	3000	450	254	496	1270	200	1: 0.25	1:0.20	35.7	41.61	2.53/105.273	
说明: 挡土墙长度以现场施工为准										合 计	700	

会 签 Joint Check up

总图		建筑	
规划		结构	
农林		电气	
公路		给排水	
水利		暖通	

备 注

* 本图纸的版权, 属中苑工程设计有限公司所有, 不得用于本工程以外范围.

* 本图纸需手续齐全方可用于施工.


平面示意 Plane Diagram

单位出图章 Company Seal



中苑工程设计有限公司
ZhongYuan Engineering Design Co., Ltd

签 署 Signature

项目负责人 Item Prin	涂梦如	
专业负责人 Chief	涂梦如	
审 定 Approved	涂梦如	
审核 Examined	王秀红	
校对 Checked	陈真荣	
设计 Designed	赵倩	

工程名称 Project



2026年欠发达国有林场巩固提升任务插岗梁省级自然保护区管护中心苗圃基础设施建设项目

子项名称 Sub Item

图纸名称 Title


挡土墙大样图

工程号 Pjt . No.		图 号 Dwg. No.	08
专 业 Dept.	建筑	阶 段 Stage	实施方案
比 例 Scale	1:100	日 期 Date	2026年5月

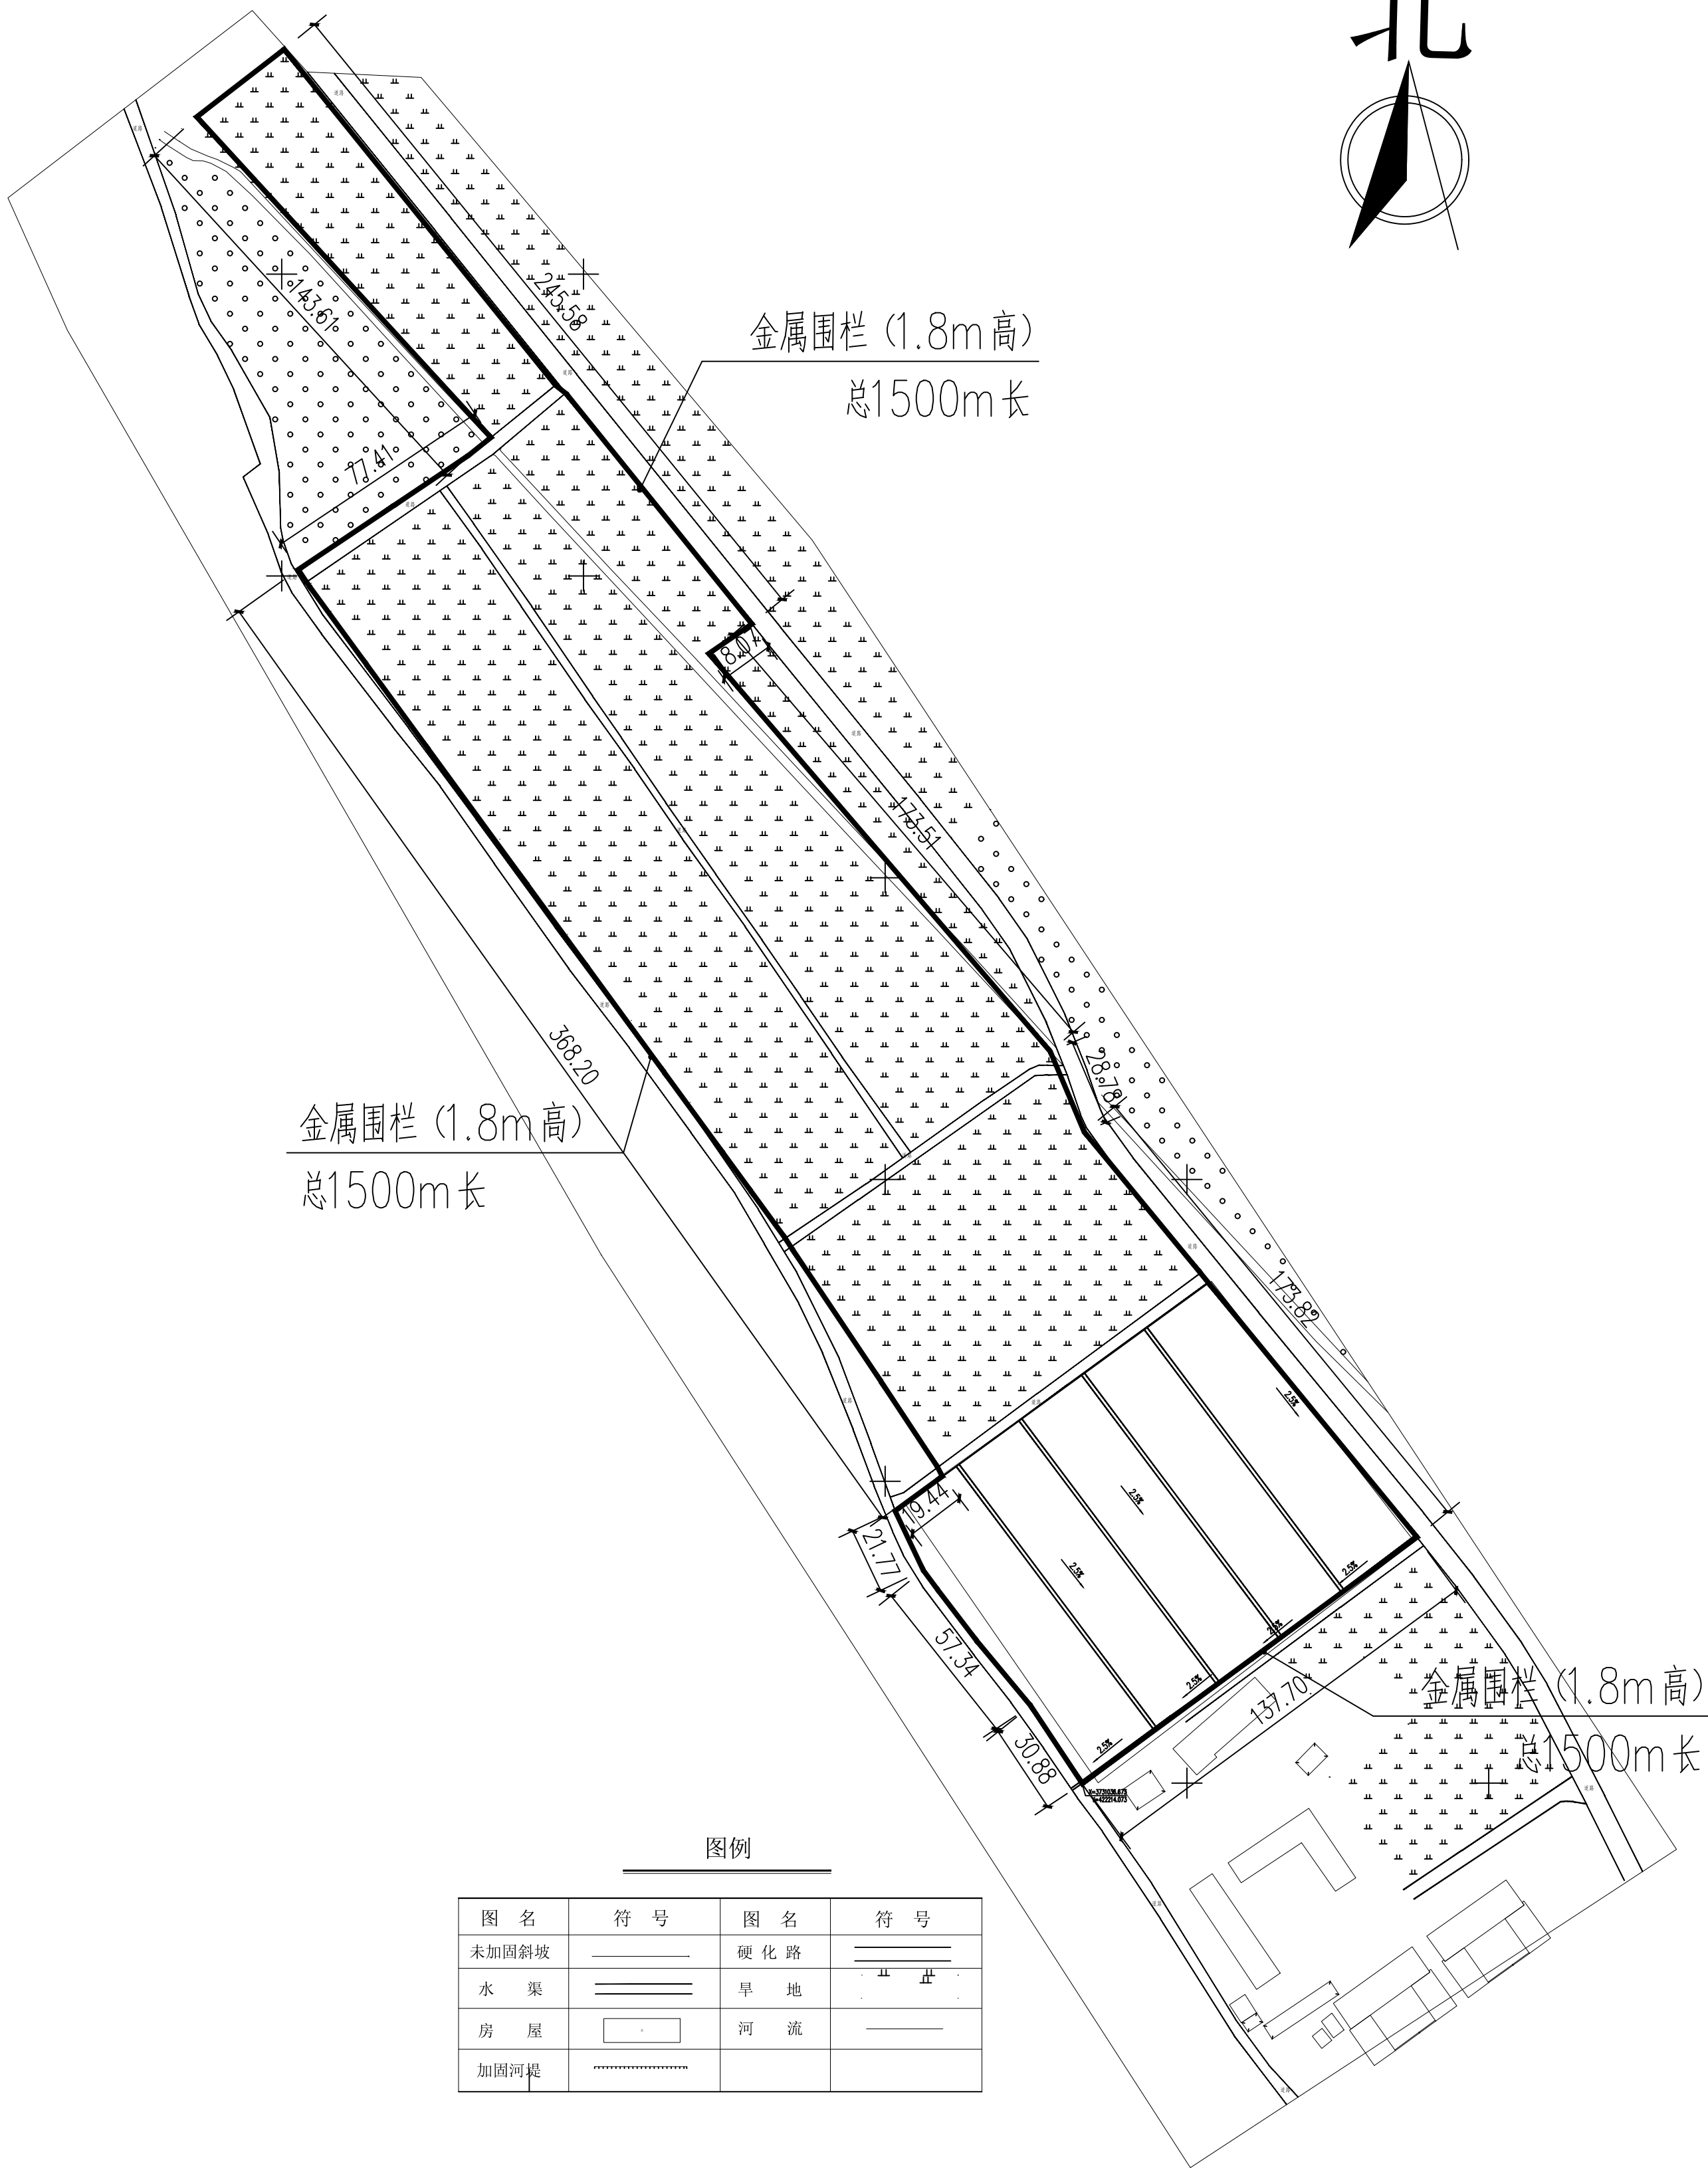

■ 会 签 Joint Check up			
总图		建筑	
规划		结构	
农林		电气	
公路		给排水	
水利		暖通	
■ 备 注			
* 本图纸版权归 属中苑工程设计有限公司所有, 不得用于本工程以外范围。 * 本图纸需手续齐全方可用于施工。			
■ 平面示意 Plane Diagram			
■ 单位出图章 Company Seal			
中苑工程设计有限公司 Zhongyuan Engineering Design Co., Ltd			
■ 签 署 Signature			
项目负责人 Lead Prin		涂梦如	涂梦如
专业负责人 Chief		涂梦如	涂梦如
审 定 Approved		王秀红	王秀红
审核 Examined		陈真荣	陈真荣
校 对 Checked		赵倩	赵倩
设计 Designed		赵倩	赵倩
■ 工程名称 Project			
2026年大达国有林场国家自然保护中心 而麓基础设施建设项目			
■ 子项名称 Sub Item			
■ 图纸名称 Title			
金属围栏总平面布置图			
工程号 Proj. No.		图 号 Draw. No.	09
专 业 Dept.	建筑	阶 段 Stage	实施方案
比 例 Scale	1:100	日 期 Date	2026年5月

工程量统计表				
	内容	单位	数量	备注
①	金属围栏 (1.8m 高)	m	1500	

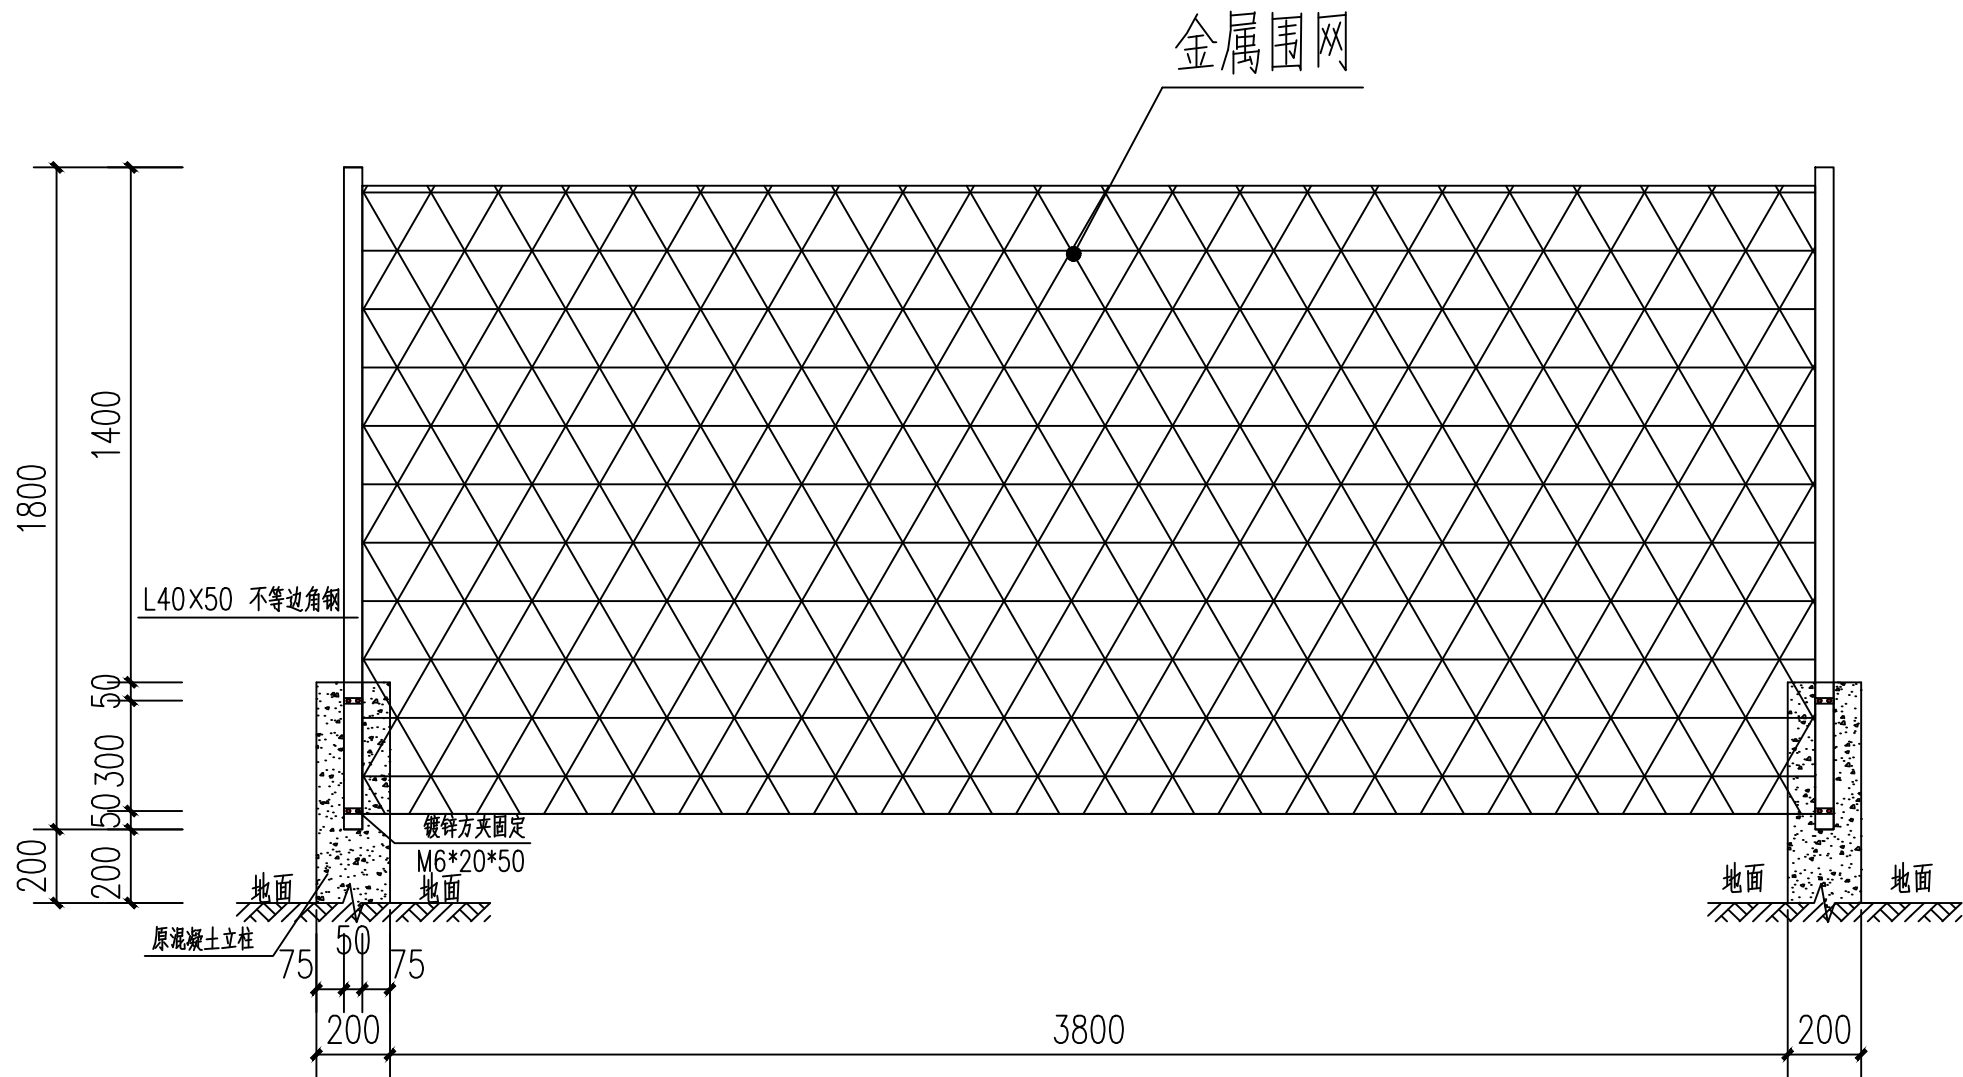

金属围栏安装做法图 1:50



镀锌方夹意向图

会 签 Joint Check up			
总图		建筑	
规划		结构	
农林		电气	
公路		给排水	
水利		暖通	
备 注			
* 本图纸的版权, 属中苑工程设计有限公司所有. 不得用于本工程以外范围.			
* 本图纸需手续齐全方可用于施工.			
平面示意 Plane Diagram			
单位出图章 Company Seal			
 中苑工程设计有限公司 ZhongYuan Engineering Design Co., Ltd			
签 署 Signature			
项目负责人 Item Prin	涂梦如	涂梦如	
专业负责人 Chief	涂梦如	涂梦如	
审 定 Approved			
审核 Examined	王秀红	王秀红	
校对 Checked	陈真荣	陈真荣	
设计 Designed	赵倩	赵倩	
工程名称 Project			
2026年欠发达国有林场巩固提升任务插岗梁省级自然保护区管护中心苗圃基础设施建设项目			
子项名称 Sub Item			
图纸名称 Title			
工程量统计表 金属围栏安装做法图			
工程号 Pjt .No.		图 号 Dwg. No.	10
专 业 Dept.	建筑	阶 段 Stage	实施方案
比 例 Scale	1:100	日 期 Date	2026年5月

2026 年欠发达国有林场巩固提升任务插岗梁省级自然保护区管护中心
苗圃基础设施建设项目

概 算 书

编制单位：中苑工程设计有限公司

编制日期：二〇二六年五月

设计概算签署页

工程名称	2026年欠发达国有林场巩固提升任务插岗梁省级自然保护区管护中心苗圃基础设施建设项目		建设地址	插岗梁管护中心沙滩保护站	
单项工程	2026年欠发达国有林场巩固提升任务插岗梁省级自然保护区管护中心苗圃基础设施建设项目				
建设单位	甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心				
编制单位	中苑工程设计有限公司		编制日期	2026年5月	
报审概算造价 (大写)	柒拾捌万陆仟元整			小写	78.60万元
建设单位 (盖章)			编制单位 (盖章)		
法定代表人 (签字盖章)			法定代表人 (签字盖章)		
			编制人 (签字盖章)		

编制说明

一、委托单位：甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心

二、工程概况：2026 年欠发达国有林场巩固提升任务插岗梁省级自然保护区管护中心苗圃基础设施建设项目。建设地址插岗梁管护中心沙滩保护站苗圃地；建设内容分别是：（1）苗圃地新建金属围栏（1.8m 高）1500m。（2）苗圃新建排水渠 800m。其中：1#排水渠（上铺夹布橡胶板）333m；2#排水渠 137m；3#排水渠 222m；4#排水渠 108m（集水井 1 座）；2#排水渠上 3 个 $\Phi 1000$ 钢筋混凝土检查井。（3）苗圃地新建浆砌石挡土墙 700m^3 。（4）苗圃地平整土方 1500m^3 。

三、编制依据

1、依据《2026 年欠发达国有林场巩固提升任务插岗梁省级自然保护区管护中心苗圃基础设施建设项目》方案设计以及相关专业说明编制。

2、《甘肃省建设工程设计概算编制审核办法》甘建价【2010】546 号文；《建设项目设计概算编审规程 CECA/GC-2023》以及《甘肃省建设工程计价规则 DBJD25-98-2022》；

3、现行《甘肃省市政工程预算定额》（2018）、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》(2019 地区基价)、《甘肃省安装工程预算定额》(2019 地区基价)及合作地区基价；

4、工程建设其他费用根据《甘肃省工程建设其他费用项目组成及有关文件汇编》及相关文件。

5、工程施工监理费按发改价格【2007】670 号文件执行。

6、工程勘察设计收费按计价【2002】10 号文执行。

7、工程预算编制费及工程结算审核费按照甘价协（2022）32 号文执行。

8、税金记取依据甘建价【2019】118 号文。

9、材料市场价格执行舟曲县第六期信息价调整，人工市场价格执行合作市第六期信息价调整。

10、《关于放开建设项目服务价格的通知》发改价格〔2015〕299 号文。

四、取费类别：三类工程

五、资金来源：2026 年中央财政常态化帮扶资金（欠发达国有林场巩固提升）和单位自筹资金。

2026年欠发达国有林场巩固提升任务插岗梁省级自然保护区管护中心苗圃基础设施建设项目概算总投资表

序号	工程（费用）名称	概算价值（万元）				总 价 （万元）	技术经济指标			占总投资 比例 （%）
		建筑工程费	设备购置 费	安装工程 费	其他费用		单位	数量	单位价格 （元 / m2）	
I	建筑安装工程费	75.00				75.00				95.42
一	2026年欠发达国有林场巩固提升任务插岗梁省级自然保护区管护中心苗圃基础设施建设项目	75.00				75.00				
1	新建金属围栏	16.46				16.46	m	1500	109.73	
2	新建排水渠	25.43				25.43	m	800	317.92	
3	新建浆砌石挡土墙	31.53				31.53	m³	700	450.48	
4	平整土方	1.58				1.58	m³	1500	10.52	
II	其他工程费				3.60	3.60				4.58
1	设计费				1.20	1.20	%			
2	监理费				1.00	1.00	%			
3	招标代理费				0.80	0.80	%			
4	结算审核费				0.30	0.30	%			
5	财务审计费				0.30	0.30	%			
III	概算总投资					78.60				100.00

单位工程费用计算表

工程名称：新建金属围栏

第 1 页 共 1 页

[illegible]

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:

单位工程概算表

工程名称:新建金属围栏

第1页 共1页

序号	定额编号	子目名称	工程量		基价	合价	人工费		材料费		机械费	
			单位	数量			单价	合价	单价	合价	单价	合价
1	3-275 换	隔离栅 铁丝编织网	100m2	27	3721.19	100472.13	1740.01	46980.27	1825.95	49300.65	155.23	4191.21
		页合计:				100472.13		46980.27		49300.65		4191.21
		表合计:				100472.13		46980.27		49300.65		4191.21

人材机价差表

工程名称:新建金属围栏

第1页 共1页

序号	材料编号	材料名称及规格	单位	数量	定额价 (元)	市场价 (元)	价差 (元)	价差合计 (元)	备注
一	人工								
1	0001003	综合工日	工日	572.93	82.00	118.00	36.00	20625.48	
价差合计(元):								20625.48	

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:

单位工程主材表

工程名称：新建金属围栏

第 1 页 共 1 页

[illegible]

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:

单位工程费用计算表

工程名称：新建排水渠

第 1 页 共 1 页

[illegible]

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:

单位工程概算表

工程名称:新建排水渠

第1页 共3页

序号	定额编号	子目名称	工程量		基价	合价	人工费		材料费		机械费	
			单位	数量			单价	合价	单价	合价	单价	合价
		1#				27410		10203.61		14221.12		2985.26
1	1-1	挖一般土方 不装车	1000m3	0.16983	3447.45	585.48	551.04	93.58			2896.41	491.9
2	4-4	管道垫层 砂	10m3	9.99	1765.21	17634.45	411.97	4115.58	1331.64	13303.08	21.6	215.78
3	1-22	填土机械碾压	1000m3	0.04995	6308.01	315.09	1215.57	60.72	61.4	3.07	5031.04	251.3
4	1-13	自卸汽车运土 1km以内	1000m3	0.11988	7104.41	851.68			49.08	5.88	7055.33	845.79
5	4-80	塑料管安装 管外径(mm以内) 315	10m	33.3	240.94	8023.3	178.19	5933.73	27.3	909.09	35.45	1180.49
		2#				8362.87		4748.58		2087.26		1527.05
6	1-1	挖一般土方 不装车	1000m3	0.08768	3447.45	302.27	551.04	48.32			2896.41	253.96
7	4-4	管道垫层 砂	10m3	1.096	1765.21	1934.67	411.97	451.52	1331.64	1459.48	21.6	23.67
8	1-22	填土机械碾压	1000m3	0.07672	6308.01	483.95	1215.57	93.26	61.4	4.71	5031.04	385.98
9	1-13	自卸汽车运土 1km以内	1000m3	0.01096	7104.41	77.86			49.08	0.54	7055.33	77.33
10	4-82	塑料管安装 管外径(mm以内) 400	10m	13.7	406.14	5564.12	303.32	4155.48	45.44	622.53	57.38	786.11
		3#				9600.63		4856.82		2831.22		1912.59
11	1-1	挖一般土方 不装车	1000m3	0.1332	3447.45	459.2	551.04	73.4			2896.41	385.8
12	4-4	管道垫层 砂	10m3	1.665	1765.21	2939.07	411.97	685.93	1331.64	2217.18	21.6	35.96
		页合计:				39171.14		15711.52		18525.56		4934.07

法定代表人:

编制单位 (盖章):

编制日期:

单位工程概算表

工程名称:新建排水渠

第2页 共3页

序号	定额编号	子目名称	工程量		基价	合价	人工费		材料费		机械费	
			单位	数量			单价	合价	单价	合价	单价	合价
13	1-22	填土机械碾压	1000m3	0.11655	6308.01	735.2	1215.57	141.67	61.4	7.16	5031.04	586.37
14	1-13	自卸汽车运土 1km以内	1000m3	0.01665	7104.41	118.29			49.08	0.82	7055.33	117.47
15	4-80	塑料管安装 管外径(mm以内) 315	10m	22.2	240.94	5348.87	178.19	3955.82	27.3	606.06	35.45	786.99
		4#				3938.36		1851.77		1303.56		783.03
16	1-1	挖一般土方 不装车	1000m3	0.06048	3447.45	208.5	551.04	33.33			2896.41	175.17
17	4-4	管道垫层 砂	10m3	0.756	1765.21	1334.5	411.97	311.45	1331.64	1006.72	21.6	16.33
18	1-22	填土机械碾压	1000m3	0.05292	6308.01	333.82	1215.57	64.33	61.4	3.25	5031.04	266.24
19	1-13	自卸汽车运土 1km以内	1000m3	0.00753	7104.41	53.5			49.08	0.37	7055.33	53.13
20	4-79	塑料管安装 管外径(mm以内) 250	10m	10.8	185.93	2008.04	133.58	1442.66	27.15	293.22	25.2	272.16
		检查井、集水井				27450.38		12208.66		14722.69		519.03
21	4-369	圆形污水检查井 混凝土井内径(mm) 1500 适用管径(mm) 800~1000 井深(m) 3.3	座	3	8284.84	24854.52	3759.21	11277.63	4376.73	13130.19	148.9	446.7
22	4-334*0.5	砖砌矩形水表井 井室净尺寸(长×宽×高)(m) 2.15×1.10×1.40 单价*0.5	座	1	2595.86	2595.86	931.03	931.03	1592.5	1592.5	72.33	72.33
		页合计:				37591.1		18157.92		16640.29		2792.89

法定代表人:

编制单位 (盖章):

编制日期:

单位工程概算表

工程名称:新建排水渠

第3页 共3页

序号	定额编号	子目名称	工程量		基价	合价	人工费		材料费		机械费	
			单位	数量			单价	合价	单价	合价	单价	合价
		铺10mm夹布橡胶板				15057.52		708.44		14349.08		
23	3-279	桥面防水层 防滑橡胶板2mm	100m2	2.976	5059.65	15057.52	238.05	708.44	4821.6	14349.08		
		页合计:				15057.52		708.44		14349.08		
		表合计:				91819.76		34577.88		49514.93		7726.96

人材机价差表

工程名称:新建排水渠

第1页 共1页

序号	材料编号	材料名称及规格	单位	数量	定额价 (元)	市场价 (元)	价差 (元)	价差合计 (元)	备注
一	人工								
1	0001003	综合工日	工日	421.68	82.00	118.00	36.00	15180.48	
二	材料								
1	0101100	钢筋	kg	1695.29	3.83	3.78	-0.06	-84.76	
2	0401008	普通硅酸盐水泥	kg	1.69	0.34	0.52	0.18	0.30	
3	0403003	砂	m3	0.00	95.00	142.02	47.02	0.00	
4	0403010	中砂	m3	185.72	95.00	142.02	47.02	8732.55	
5	0503031	板方材	m3	0.04	1933.87	2029.14	95.27	3.81	
价差合计(元):								23832.38	

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:

单位工程主材表

工程名称：新建排水渠

第 1 页 共 1 页

序号	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合计（元）	备注
1	商品混凝土	C30	m3	0.27	482	130.14	
2	商品混凝土	C25	m3	13.35	473	6314.55	
3	商品混凝土	C15	m3	2.26	450	1017.00	
4	HDPE双壁波纹管	DN300,	m	555.00	107	59385.00	
5	双壁波纹管		m	108.00	78	8424.00	
6	HDPE双壁波纹管	DN400,	m	137.00	169	23153.00	
7	铸铁井盖	Φ700	套	3.00	488.95	1466.85	
	合计					99890.54	

法定代表人：

编制单位(盖章)：

编制日期：

单位工程费用计算表

工程名称：新建浆砌石挡土墙

第 1 页 共 1 页

[illegible]

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:

单位工程概算表

工程名称:新建浆砌石挡土墙

第1页 共1页

序号	定额编号	子目名称	工程量		基价	合价	人工费		材料费		机械费	
			单位	数量			单价	合价	单价	合价	单价	合价
1	3-179 换	浆砌块石 墩、台、墙、 河堤 换为【毛石】	10m3	70	3578.13	250469.1	129.99	9099.3	2367.99	165759.3	1080.15	75610.5
		页合计:				250469.1		9099.3		165759.3		75610.5
		表合计:				250469.1		9099.3		165759.3		75610.5

人材机价差表

序号	材料编号	材料名称及规格	单位	数量	定额价 (元)	市场价 (元)	价差 (元)	价差合计 (元)	备注
一	人工								
1	0001003	综合工日	工日	110.97	82.00	118.00	36.00	3994.92	
二	材料								
1	0403010	中砂	m3	12.39	95.00	142.02	47.02	582.58	
2	0405084	碎石	m3	7.84	85.00	125.55	40.55	317.91	
3	C00293	焊接钢管(综合)	kg	5940.20	4.00	4.29	0.29	1722.66	
价差合计(元):								6618.07	

单位工程费用计算表

工程名称：平整土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:

单位工程概算表

工程名称:平整土方

第1页 共1页

序号	定额编号	子目名称	工程量		基价	合价	人工费		材料费		机械费	
			单位	数量			单价	合价	单价	合价	单价	合价
1	1-1 换	挖一般土方 不装车	1000m3	1.5	5486.3	8229.45	2589.89	3884.84			2896.41	4344.62
		页合计:				8229.45		3884.84				4344.62
		表合计:				8229.45		3884.84				4344.62

人材机价差表

工程名称:平整土方

第1页 共1页

序号	材料编号	材料名称及规格	单位	数量	定额价 (元)	市场价 (元)	价差 (元)	价差合计 (元)	备注
一	人工								
1	0001003	综合工日	工日	47.38	82.00	118.00	36.00	1705.68	
价差合计(元):								1705.68	

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:

单位工程主材表

工程名称: 平整土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:
